



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2022
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-06-00676**

Elab :2022-06-16

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V. - FACTURA NO. F41
ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULA DE IDIOMAS
CONTRATO NO. 027/22AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 387,846.00 (FINIQUITO)

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2066	PAG	1630	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V.	\$ 232,707.60	
5135-1000	PAR	3510100	PAG	1630	FACTURA NO. F41/SOL.MTTO 935-C ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR AREA PETARONAL DE AULAS DE IDIOMAS	\$ 232,707.60	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 1630 DEP) SERVICIOS Y CONSTRUC - FACTURA NO. F41 ADECUACIÓN DE		\$ 232,707.60
2112-1000	PRV	2066	PAG	1630	FACTURA NO. F41/SOL MTTO 935-C ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR AREA PETARONAL DE AULAS DE IDIOMAS		\$ 232,707.60
TOTALES POLIZA						\$ 465,415.20	\$ 465,415.20

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



Pagos SPEI enviados

Ps. 06.676
29/6

Fecha: 15/06/2022

Hora: 07:19:25

Página: 1

Fecha valor: 15/06/2022 Clave de Rastreo: HSBC204093
Fecha de liquidación: 15/06/2022 Hora de liquidación: 11:23:09 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F 41 GLOMORSA
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 232,707.60

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 058078160677600388 Referencia Numérica: 1630
Nombre del Beneficiario: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA
Banco Receptor: BANREGIO
Concepto de Pago: F 41 GLOMORSA

*Liberado
a/pem*



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.

01 (544) 411-0700

UAA750303NHA

Beneficiario

2066

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GEOMARSA, S.A. DE C.V.

10 DE JUNIO DE 2022

No.1686

Factura	uuid	Importe	I.E.P.S.	Importe
F41	PAGO DIRECTO DOCUMENTO 1630	232,707.60	0.00	232,707.60
TOTALES				232,707.60

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022
PAGO DIRECTO
 FORMATO: F-7.14-1



Imprimir

DOCUMENTO No. 1630 **PAGO DIRECTO**

Entidad Federativa : **5 - COAHUILA DE ZARAGOZA**

Región : **5 -**

Municipio : **30 - SALTILLO**

Finalidad : **25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR**

Unidad Responsable : **410302011 -**

Sub Programa : **4040 - MANTENIMIENTO REHABILITACION DE EDIFICIOS**

Solicitante **549-BURCIAGA VERA GUSTAVO ALFONSO**

Concepto **FACTURA NO. F41 ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULA DE IDIOMAS, CONTRATO NO. 027/22AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 387,846.00 (FINIQUITO)**

BENEFICIARIO **2066 - SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V.**

Cuenta Bancaria



Part.	Descripción de la Partida	Importe
3510100	FACTURA NO. F41/SOL.MTTO.935-C ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR AREA PEATONAL DE AULAS DE IDIOMAS	\$ 232,707.60
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 232,707.60



Ramiro

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA SA DE CV

CALABACILLAS 102
COL. LOMA LINDA LOC. SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA C.P. 25016
MEXICO

RFC: SCG170224RE6
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar, fecha y hora de expedición: 25016 2022-05-30 08:00:00

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC: UAA750303NHA
Uso CFDI: P01-Par definir

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: Cantidad, Clave, Clave Prod/Servicio, Descripción, Clave unidad, Unidad, Valor Unitario, Descuento, Importe. Row 1: 1, 001, 72101507- Servicio de mantenimiento de edificios, PAGO DE LOS TRABAJOS DE PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS. CON NÚMERO DE CONTRATO No 027/22/AD Mto. TOTAL DEL CONTRATO \$387,846.00 TOTAL DEL ANTICIPO \$155,138.40 TOTAL CONTRATO MENOS ANTICIPO \$232,707.60 (IVA INCLUIDO)

TRASLADO: Base: 200610 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$32,097.60

Summary table with columns: Traslado, Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%, Subtotal, Total, Moneda, Tipo de cambio. Values: \$200,610.00, \$32,097.60, \$232,707.60, MXN, 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|8DBC876E-E07F-4FFF-BB2F-F287E1DF1F2C|2022-05-30T08:22:19|SST060807KU0|NYV1FdvR56Oh3Ogwp3foGrc3A5oZ+RjiUH/n65AAyT7gXbkxJUyD1bjMu+PYEmbWzVMilCxY8uyPPnAQIUx34yeq8BBGJQafswflnutVWjFYWAqlqL3OPHlyjA9Hk+r/8ByVXdv...

Sello Digital del Emisor: NYV1FdvR56Oh3Ogwp3foGrc3A5oZ+RjiUH/n65AAyT7gXbkxJUyD1bjMu+PYEmbWzVMilCxY8uyPPnAQIUx34yeq8BBGJQafswflnutVWjFYWAqlqL3OPHlyjA9Hk+r/8ByVXdv...

Sello Digital del SAT: G9dVhVliepCWT79N7Z7f0MGkqFMRLmmq6E0bizIBV+EJskS8U2mqOwReljPsFxnU162FJwG1kBRNVjX7Nm2U+ItrmgvTUHNahcbVRS317uSU6rkEBbuZjQLIEYxmAktio6xyqzNH2By48k4QK7sBGKbyaZc...

Certificado: MIIgVjCCBD6gAwBAGIUMDAwMDEwMDA1MDc5NDIzNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEmsAwHigYDVQQDDbBVRPUKIEQUgQ0VSVSEIGUNBRE9SQTUEmCWGA1UECgwU0VSVKIDSU8...

Folio Fiscal: 8DBC876E-E07F-4FFF-BB2F-F287E1DF1F2C
Fecha y Hora de Certificación: 30/05/2022 08:22:19
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507942357
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789
Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: 1
Versión: 3.3
RFC Prov Cert: SST060807KU0




Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="F" Fecha="2022-05-30T08:00:00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="200610.00" Total="232707.60" FormaPago="03" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="25016" NoCertificado="00001000000507942357" Folio="41" Certificado="MIIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc5NDIzNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUKIEQUQgQ0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVkIDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQIVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUIFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYulEhJREFMR08gNzcslENPTC4gR1VFUIJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0IVREFEIERFIE1FWWEIDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBM1UELMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTo0gQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCTBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJQIVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJQIVZRU5URTAeFw0yMTA2MjYwNTA4MDFaFw0yMTA2MjYwNTA4MDFaMIIBIzE1MDMGA1UEAxMsU0VSVkIDSU9TIFkgQ09OU1RSVUNDSU9ORVMgR0xPTUFSU0EgU0EgREUgQ1YxNTAzBgNVBCKTLFNFUJZJQ0IPUyBZIENPTINUUIVDQ0IPTkVTIE dMT01BUINBIFNBIERFIENWMTUwMwYDVQQKEyxTRVJWSUNJT1MgWSBBDT05TVFJVQ0NJT05FUyBHTE9NQVJTQSBSBDBVjEIMCMGA1UELRMcU0NHMTcwMjI0UkU2I C8gTE9NRzcxMDMwOFA1QTEeMBwGA1UEBRMVIC8gTE9NRzcxMDMwOE1DTFBOTDA yMTUwMwYDVQQLEyxTRVJWSUNJT1MgWSBBDT05TVFJVQ0NJT05FUyBHTE9NQVJTQ SBTQSBSBDBVjCCASlWdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALtgTlJUxrQ DHEAQ/KvRLGoMls+zLSAawnrtiOu1GNWU8x/ Delwu3DRAMNpb6Hxm6ouUnma0rWWvUHGXNZQbxvBFnSDd+oEwslkPBWWqa6i9/ ZcBJsgAZHBthKZXHHcRuEIS4KsLwDceCoglr9Wxt24OpzMpz/ 9gMnWY9+sXVwCwednF0oAvlWcfRkh+bhHDCF1AF42TKp5rs43XteqyTT7SX4QHAr B0vlzaxdoR8sVwatbDhfCG6xaQSVcrUTvbJ0JYTF6Ygi8cHhMm23XsXLevlwdYTJu3+eT 3ZXui9UATw2+biNlgPQWyRUVGasnoX3F7zB06heK8Wupd1CgSECAwEAAAMdMBswDAYDVR0TAQH/ BAlwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGBCkz9/ OvioHVuLhc7Leqelg18xK8+dbKAaT1oqRHfN2X2Sg1hJNO6h1McahvjV/ CgV1+Ahphpjgc1jiwe9rWRgFWunincvjNngMXnWrD/ otWOPESZJrCCYKzv24NAwRA4yXBwObE54UD8QXxAnwppUIVOqlslQJhjnNb7UGYZVjL 37fhyQsXYAra83QZUBCQnRM804Lfs95cCLUriflhoUGb/ 2A0i7y3mb28RQx8fvlOlVHJYdTQThzVjMELucDFu8ntMyoHarlTq1nMaO03SUpplaTz9Uw QCcl3aB3oETntwq034G8Z5qeaUTo+Cj15/n2B6WRa0XLaU/ eymQi620fAN9ymYr6TTshgqRUtuc6zr782d6xMBN0nYCUu52O22cSEL5fOHmKRgwIRP lp72jDVDmiSkfKPSeyk7TDMtNEwCJqkC55c953nj+J3N8NO3f9uoCMG4MbAjQR3gy OSTWPKNiLkzSwHvi1rFI8615sF0YP63Cgan7XtfOLfPdbVPcW98iyfuZwEZQ78OXmpC

A+qYNDryW7BczS3BsDE95CdA1YGI9PKi4eY5XBivPDXXztW0wyupACsll6oduu4j3NL9
SNj477/6Snfjib4yPoUhfbaWyEBZh5iawXQ+Vfwlv6PiVSkqWc7QE0g/
aLNVpbMPMTyUNCSagxxbQVC" Sello="NYV1FdvrS6Oh3Ogxwp3foGrc3A5oZ+RjiUH/
n65AAyT7gXbkxJUyD1bljMu+PYEmbzwVMilCxrY8uyPPnAQIUX34yeq8BBGJQafswfilnut
VWjPYWAlqleL3OPHIyJA9Hk+r/
8ByVXdvpkLI5psSeXlf3m4cCinzaeqGSuShfncso0qKTdlzsriYHanDG8DOodV412s5oXT
00iLf+aP0gPEOwiLmOmDq5U4cwbtkgqlsEsa7lrBQ1bS/
py07t0X6jFy5l5pASjpr7cjseT26gNKNz0pmH/
0avTnbXSM2FzDD2o9Aom9OcqI9FRX2NoChUxMu38ptLEDqjQqaqQIQ=="><cfdi:Emis
or Rfc="SCG170224RE6" Nombre="SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA SA
DE CV" RegimenFiscal="601" /><cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA"
Nombre="UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" UsoCFDI="P01" /
><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101507" Noidentificacion="001"
Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="PAGO DE LOS
TRABAJOS DE PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR
ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS. CON NÚMERO DE CONTRATO No 027/22/
AD Mto. TOTAL DEL CONTRATO \$387,846.00 TOTAL DEL ANTICIPO \$155,138.40
TOTAL CONTRATO MENOS ANTICIPO \$232,707.60 (IVA INCLUIDO)"
ValorUnitario="200610.00"
Importe="200610.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="200610" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="32097.6" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></
cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="32097.60"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="32097.60" /></
cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/
2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/
TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/
TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="8DBC876E-E07F-4FFF-BB2F-
F287E1DF1F2C" FechaTimbrado="2022-05-30T08:22:19"
RfcProvCertif="SST060807KU0"
SelloCFD="NYV1FdvrS6Oh3Ogxwp3foGrc3A5oZ+RjiUH/
n65AAyT7gXbkxJUyD1bljMu+PYEmbzwVMilCxrY8uyPPnAQIUX34yeq8BBGJQafswfilnut
VWjPYWAlqleL3OPHIyJA9Hk+r/
8ByVXdvpkLI5psSeXlf3m4cCinzaeqGSuShfncso0qKTdlzsriYHanDG8DOodV412s5oXT
00iLf+aP0gPEOwiLmOmDq5U4cwbtkgqlsEsa7lrBQ1bS/
py07t0X6jFy5l5pASjpr7cjseT26gNKNz0pmH/
0avTnbXSM2FzDD2o9Aom9OcqI9FRX2NoChUxMu38ptLEDqjQqaqQIQ=="
NoCertificadoSAT="00001000000506202789"
SelloSAT="G9dVhVliepCWT79N7Z7vf0MGkqFMRLmmq6E0blzIBV+EJSks8U2mqOwRe
hjPsFxnU162FJwG1kBRNVjX7Nm2U+ItrngvTUHNahcbVRS317uSU6rkEBbuZjqLIEYxmAk



tio6xytZqqNH2By48k4QK7sBGKbyaZcaOqULqNNmN5Xck6yDeYD6HhRKFvuSffrVB6N
TZeq/
oENJjisaNqUgS89V3Tb9pDuwGY35O7AdNHB02j8StGyY5OUu0IAA6rROnRWSE2kYKg
PiK3qL2HgizLx6DE6ty+vGRwLcA3PBsPgm3ly5mCz6rwnAZCt7tyPctqB2/92+Lp3elitXg
Xfilg==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

Banyo

HL

A

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<cfdi:Comprobante

Sello="NYV1FdvrS6Oh3Ogwp3foGrc3A5oZ+RjiUH/n65AAyT7gXbkxJUyD1bIjMu+PYEmbwbzVMilCxrY8uyPPnAQIUX34yeq8BBGJQafswfilntVWjPYWAIql

Certificado="MIIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDEc5NDIzNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBBVVRPUkIEQI

Folio="41" NoCertificado="00001000000507942357" LugarExpedicion="25016" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" FormaPago="03" Total="232707.60"

SubTotal="200610.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Fecha="2022-05-30T08:00:00" Serie="F" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA SA DE CV" Rfc="SCG170224RE6"/>

<cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" Rfc="UAA750303NHA" UsoCFDI="P01"/>

<cfdi:Conceptos>

- <cfdi:Concepto Importe="200610.00" ValorInicitario="200610.00" Descripción="PAGO DE LOS TRABAJOS DE PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS. CON NÚMERO DE CONTRATO No 027/22/AD Mtto. TOTAL DEL CONTRATO \$387,846.00 TOTAL DEL ANTICIPO \$155,138.40 TOTAL CONTRATO MENOS ANTICIPO \$232,707.60 (IVA INCLUIDO)" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="001" ClaveProdServ="72101507"/>

- <cfdi:Impuestos>

- <cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="32097.6" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="200610"/>

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

</cfdi:Concepto>

</cfdi:Conceptos>

- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32097.60">

- <cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="32097.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

- <cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

SelloSAT="G9dVhVlipeCWT79N7Z7vf0MGkqFMRLmmq6E0blzIBV+EJSkS8U2mqOwRehJPsFxnU162FJwG1kBRNVjX7Nm2U+HtrngvTUHNahcb

NoCertificadoSAT="00001000000506202789"

SelloCFDI="NYV1FdvrS6Oh3Ogwp3foGrc3A5oZ+RjiUH/n65AAyT7gXbkxJUyD1bIjMu+PYEmbwbzVMilCxrY8uyPPnAQIUX34yeq8BBGJQafswfi

RfcProvCertif="SST060807KU0" FechaTimbrado="2022-05-30T08:22:19" UUID="8DBC876E-E07F-4FFF-BB2F-F287E1DF1F2C"

xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>

</cfdi:Complemento>

</cfdi:Comprobante>

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCG170224RE6	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA SA DE CV	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8DBC876E-E07F-4FFF-BB2F-F287E1DF1F2C	2022-05-30T08:00:00	2022-05-30T08:22:19	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$232,707.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Reynal 




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**Comité de Obras y Servicios Relacionados
con las mismas**

Calzada Antonio Narro 1923, Colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 4110200 ext. 2014. Tel.dir (844) 411 02 08
e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx - Página Web: www.uaaan.edu.mx



Saltillo, Coah. A 09 de mayo de 2022

CONSTANCIA

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V.**, en cumplimiento al contrato **027/22 AD. MTTO. ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS**, y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el anticipo, el cumplimiento, vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 0016067760038

Cheque Número: 0000130

Cantidad: \$155,138.40 (ciento cincuenta y cinco mil ciento treinta y ocho pesos 40/100 M.N.) por el 40% de garantía de Anticipo.

Cheque Número: 0000129

Cantidad: \$33,435.00 (treinta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de vicios ocultos.

Cheque Número: 0000131,

Cantidad: \$33,435.00 (treinta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de cumplimiento.

Sucursal: 016, Saltillo, Coah.

Titular de la cuenta: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V.

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados cuando haya concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

**ATENTAMENTE
ALMA TERRA-MATER**

**M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y PRESIDENTE DEL COYSRM**

Ccp. Archivo

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA S.A. DE C.V.
SCG170224RE6
Suc 016 PERIFERICO
CUENTA 016067760038

Naranja Negocios Full

09/mayo/2022
Fecha

Páguese este cheque a la orden de:

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro \$ 155,138.40

(Ciento cincuenta y cinco mil ciento treinta y ocho pesos 40/100 M.N.)
Moneda Nacional

250122
0570002889

banregio

Banco Regional S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero

[Signature]

Firma

16461511180585160677600380000130

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA S.A. DE C.V.
SCG170224RE6
Suc 016 PERIFERICO
CUENTA 016067760038

Naranja Negocios Full

09/mayo/2022
Fecha

Páguese este cheque a la orden de:

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro \$ 33,435.00

(Treinta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)
Moneda Nacional

250122
0570011163

banregio

Banco Regional S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero

[Signature]

Firma

28081511180585160677600380000129

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA S.A. DE C.V.
SCG170224RE6
Suc 016 PERIFERICO
CUENTA 016067760038

Naranja Negocios Full

09/mayo/2022
Fecha

Páguese este cheque a la orden de:

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro \$ 33,435.00

(Treinta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)
Moneda Nacional

250122
0570007738

banregio

Banco Regional S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero

[Signature]

Firma

65771511180585160677600380000131

[Large Signature]

Saltillo, Coahuila a, 30 de Mayo del 2022.


AT'N. Ing. Gustavo A. Burciaga Vera
Jefe del Departamento de Obras.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Presente.

Asunto; Anticipo

Por medio de la presente me permito informarle que la empresa SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA S.A. DE C.V., recibe de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro la cantidad de: \$ 232,707.60 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N.) Por concepto de estimación finiquito de la obra ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS. Con número de contrato 027/22/AD Mto Dándose por recibido y de conformidad la cantidad antes mencionada.

Atentamente

Ing. Juan Ángel Galván Ledesma
Representante Legal




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 CALZADA ANTONIO NARRO #1923, COL. BUENAVISTA
 SALTILLO, COAHUILA CP 25315
 RFC: UAA750303NHA

FECHA 30/05/2022

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO LA CANTIDAD DE \$ 232,707.60 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION N°.: 1 (UNO FINIQUITO) DEL CONTRATO No. 027/22/AD Mtto RELATIVO A LA OBRA: ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.

INTEGRACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL
PAGO DE LOS TRABAJOS DE PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS. CON NUMERO DE CONTRATO No. 027/22/AD Mtto TOTAL DEL CONTRATO \$387.846.00 TOTAL DE ANTICIPO \$155,138.40 TOTAL CONTRATO MENOS ANTICIPO: \$232,707.60 (IVA INCLUIDO)	1	SERVICIO	\$200,610.00	\$200,610.00
Ing. Juan Angel Galván Ledesma Representante Legal de Servicios y Construcciones Glomarsa S.A. de C.V.				SUBTOTAL \$200,610.00 I.V.A. \$ 32,097.60 TOTAL \$232,707.60

IMPORTE CONLETRA
 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N.)



OBRA: ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULAS, E IDIOMAS

FECHA: 04/04/2022

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZO Y NIVELACION 80 x 10	M2	800.00	\$ 5.00	\$ 4,000.00
2	LIMPIEZA DE REGISTROS SANITARIOS Y NIVELACION DE TAPA ARMADA DE CONCRETO	PZAS	7.00	\$ 800.00	\$ 5,600.00
3	RETIRO DE BASES DE CONCRETO Y TRUENO EXISTENTE EN AREAS INDICADAS	ML	38.00	\$ 300.00	\$ 11,400.00
4	ADECUAR Y FABRICAR JARDINERAS DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 SIMILAR A EXISTENTES ACABADO CERROTADO Y BASE DE CONCRETO ARMADA ACABADO PINTURA OCRE ESMALTE, EXCAVACION, ENRASE, MURO DE BLOCK, CASTILLO, CERROTEADO ESTRUCTURAL, BASE DE CONCRETO ACABADO PINTURA OCRE.	ML	175.00	\$ 650.00	\$ 113,750.00
5	COLECTOR PLUVIAL DE REJILLA METALICA 18 MTS LINEALES CON CANAL DE CONCRETO PARA CRUCE DE CALLE Y TUBO PVC DE 6" A JARDIN O REGISTRO SANITARIO.	ML	18.00	\$ 700.00	\$ 12,600.00
6	RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA EN ACCESOS PRINCIPALES Y ANDADOR	M2	200.00	\$ 80.00	\$ 16,000.00
7	FIRME DE CONCRETO f'c=150 kg/cm2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10 ACABADO PULIDOY CUADROS, VOLTEADOR EN JUNTAS, INCLUYE: NIVELACION, CIMBRADO, VACIADO, DECIMBRADO Y CURADO.	M2	450.00	\$ 380.00	\$ 171,000.00
SUBTOTAL					\$ 334,350.00
IVA					\$ 53,496.00
TOTAL					\$ 387,846.00

Ramirez

[Handwritten signature]



KALEMON
S.A. DE C.V.

OBRA: ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULAS, E IDIOMAS

04/04/2022

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UD	CANT	PU	TOTAL
1	TRAZO Y NIVELACION 80 x 10	M2	800.00	\$ 5.38	\$ 4,301.69
2	LIMPIEZA DE REGISTROS SANITARIOS Y NIVELACION DE TAPA ARMADA DE CONCRETO	PZAS	7.00	\$ 860.34	\$ 6,022.36
3	RETIRO DE BASES DE CONCRETO Y TRUENO EXISTENTE EN AREAS INDICADAS	ML	38.00	\$ 322.63	\$ 12,259.81
4	ADECUAR Y FABRICAR JARDINERAS DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 SIMILAR A EXISTENTES ACABADO CERROTADO Y BASE DE CONCRETO ARMADA ACABADO PINTURA OCRE ESMALTE, EXCAVACION, ENRASE, MURO DE BLOCK, CASTILLO, CERROTEADO ESTRUCTURAL, BASE DE CONCRETO ACABADO PINTURA OCRE.	ML	175.00	\$ 699.02	\$ 122,329.23
5	COLECTOR PLUVIAL DE REJILLA METALICA 18 MTS LINEALES CON CANAL DE CONCRETO PARA CRUCE DE CALLE Y TUBO PVC DE 6" A JARDIN O REGISTRO SANITARIO.	ML	18.00	\$ 752.80	\$ 13,550.31
6	RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA EN ACCESOS PRINCIPALES Y ANDADOR	M2	200.00	\$ 86.03	\$ 17,206.75
7	FIRME DE CONCRETO f'c=150 kg/cm2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10 ACABADO PULIDO Y CUADROS, VOLTEADOR EN JUNTAS, INCLUYE: NIVELACION, CIMBRADO, YACIADO, DECIMBRADO Y CURADO.	M2	450.00	\$ 408.66	\$ 183,897.13
				SUBTOTAL	\$ 359,567.28
				IVA	\$ 57,530.76
				TOTAL	\$ 417,098.04

Kalemon, S.A. de C.V.

Tel. 844 609 9867

CALLE A N° 186
COL. RINCON DE SAN VICENTE,
SALTILLO, COAHUILA.
C.P. 25124

kalemon@outlook.es



KALEMON
S.A. DE C.V.



ING. OSCAR ALMANZA CALDERON

TORRE DE LAS ORQUIDEAS N° 244 COL. VALLE DE LAS TORRES C.P. 25115 | TEL: (844) 434-7990 SALTILLO, COAHUILA.

DESCRIPCION
DE OBRA:
FECHA:

ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULAS, E IDIOMAS

04/04/2022

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZO Y NIVELACION 80 x 10	M2	800.00	\$ 5.51	\$ 4,301.69
2	LIMPIEZA DE REGISTROS SANITARIOS Y NIVELACION DE TAPA ARMADA DE CONCRETO	PZAS	7.00	\$ 881.74	\$ 6,172.19
3	RETIRO DE BASES DE CONCRETO Y TRUENO EXISTENTE EN AREAS INDICADAS	ML	38.00	\$ 330.65	\$ 12,564.82
4	ADECUAR Y FABRICAR JARDINERAS DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 SIMILAR A EXISTENTES ACABADO CERROTADO Y BASE DE CONCRETO ARMADA ACABADO PINTURA OCRE ESMALTE, EXCAVACION, ENRASE, MURO DE BLOCK, CASTILLO, CERROTEADO ESTRUCTURAL, BASE DE CONCRETO ACABADO PINTURA OCRE.	ML	175.00	\$ 716.42	\$ 125,372.66
5	COLECTOR PLUVIAL DE REJILLA METALICA 18 MTS LINEALES CON CANAL DE CONCRETO PARA CRUCE DE CALLE Y TUBO PVC DE 6" A JARDIN O REGISTRO SANITARIO.	ML	18.00	\$ 771.52	\$ 13,887.43
6	RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA EN ACCESOS PRINCIPALES Y ANDADOR	M2	200.00	\$ 88.17	\$ 17,634.84
7	FIRME DE CONCRETO $f_c=150$ kg/cm ² DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10 ACABADO PULIDO Y CUADROS, VOLTEADOR EN JUNTAS, INCLUYE: NIVELACION, CIMBRADO, VACIADO, DECIMBRADO Y CURADO.	M2	450.00	\$ 418.83	\$ 188,472.30
				SUBTOTAL	\$ 368,405.93
				IVA 16%	\$ 58,944.95
				TOTAL	\$ 427,350.88
(CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 MN)					

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten symbol]

Saltillo, Coahuila a, 11 de abril de 2022

AT'N. Ing. Gustavo A. Burciaga Vera
Jefe del Departamento de Obras.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Presente.


Asunto; Inicio

Por medio de la presente me permito informarle que, con fecha del 11 de abril de 2022, damos por iniciada la obra correspondiente a: **ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS** con número de contrato **027/22/AD MTTO** asignado a mí representada por esta institución.

Se comunica lo anterior para los trámites que correspondan.

Atentamente


Ing. Juan Angel Galván Ledesma
Representante Legal



(844) 390 6960

administracion@scgsa.com.mx
ing.jgalvan@gmail.com

Calabacillas 102 Col.
Loma Linda C.P. 25016



Saltillo, Coahuila a, 24 de mayo del 2022

AT'N. Ing. Gustavo A. Burciaga Vera
Jefe del Departamento de Obras.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Presente.

Asunto; Término

Por medio de la presente me permito informarle que, con fecha del 24 de mayo de 2022, damos por terminada la obra correspondiente a: **ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS** con número de contrato **027/22/AD MTTO** asignado a mí representada, lo anterior conforme a la cláusula Noventa. -
Recepción de los Trabajos

Se comunica lo anterior para los trámites que correspondan.

Atentamente


Ing. Juan Angel Galván Ledesma
Representante Legal





(844) 390 6960

administracion@scgsa.com.mx
ing.jgalvan@gmail.com

Calabacillas 102 Col.
Loma Linda C.P. 25016




OBRA	PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.	CONTRATO 027/22/AD Mtto		
Clave	Concepto	unidad	cantidad	Importe
	TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	800	\$4000.00

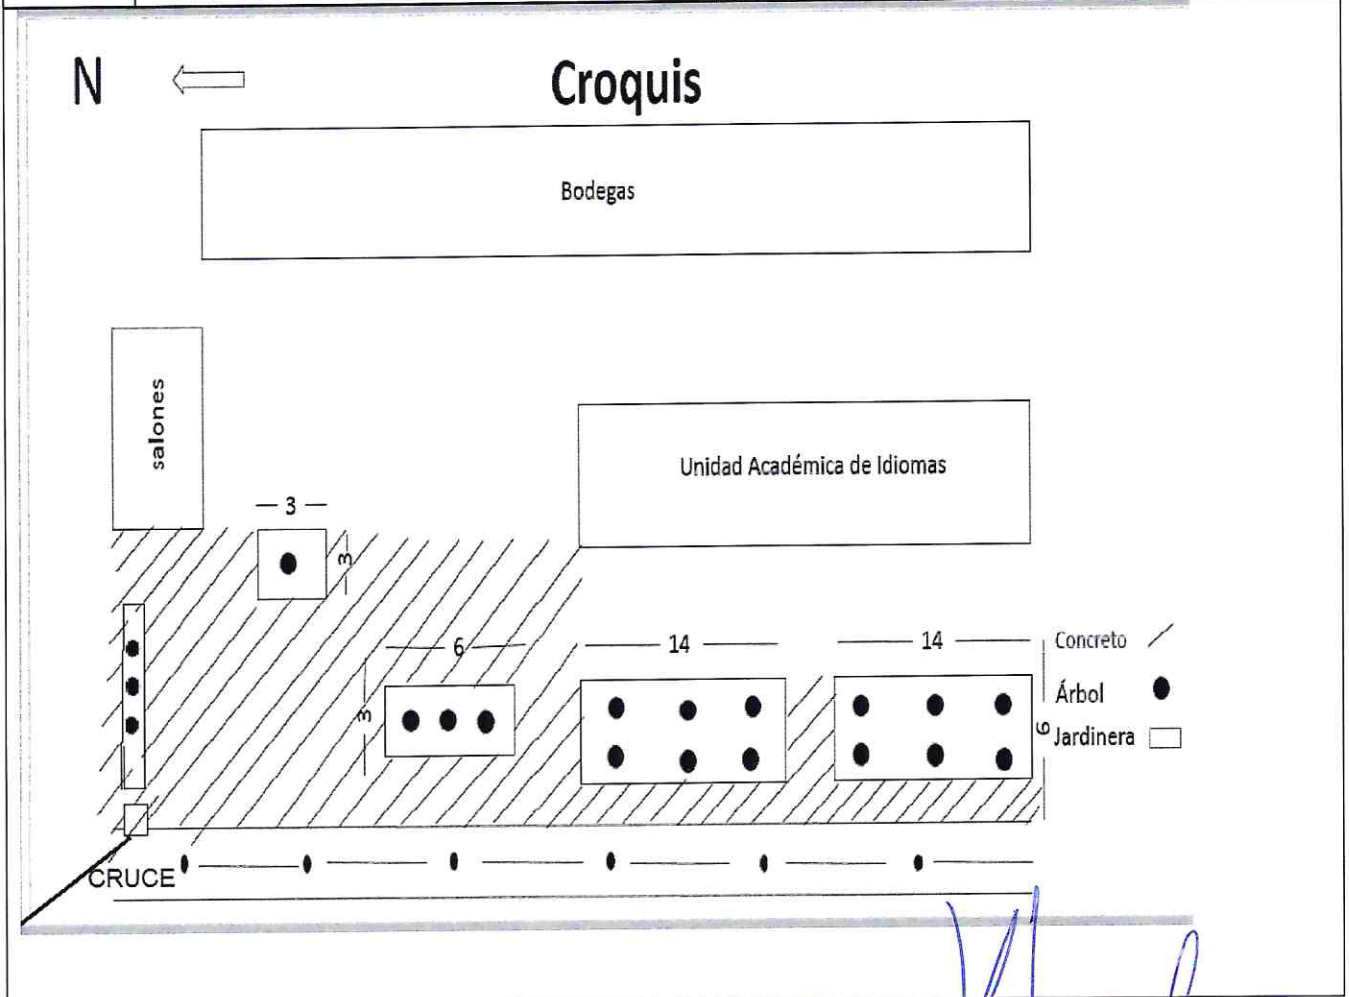

Ing. Marco Antonio Martínez Salas
 Servicios y Construcciones Glomarsa, S.A. de C.V.

Arq. Mario Gutierrez Mendoza
 Supervisor de Obras por la UAAAN

OBRA	PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.	CONTRATO 027/22/AD Mtto		
Clave	Concepto	unidad	cantidad	Importe
	LIMPIEZA DE REGISTROS SANITARIOS NIVELACION DE TAPAS ARMADAS DE CONCRETO	PZAS	7	\$5,600.00

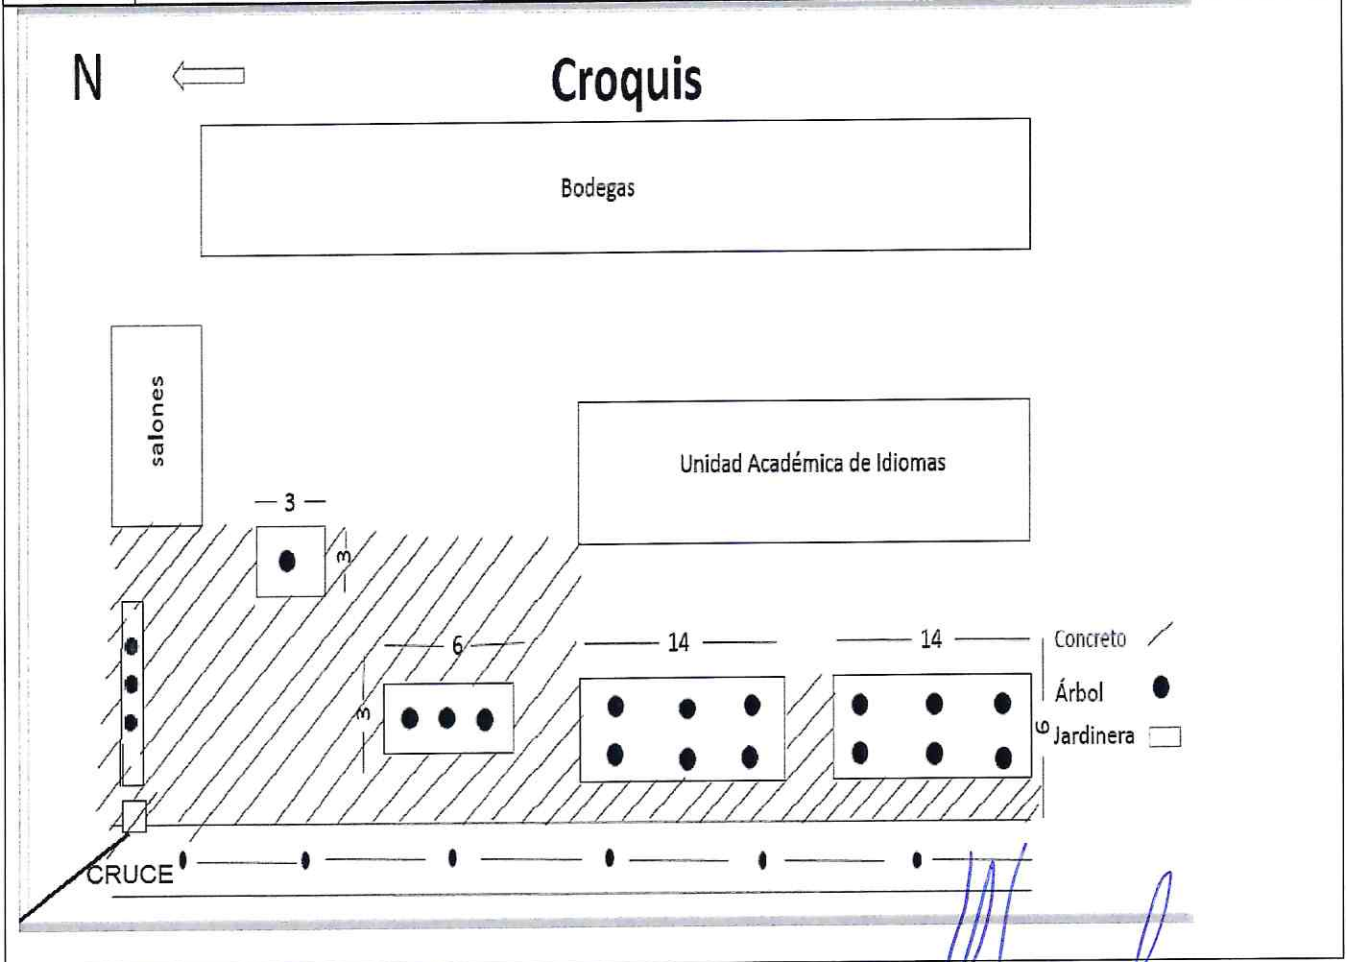

Ing. Marco Antonio Martínez Salas
 Servicios y Construcciones Glomarsa, S.A. de C.V.


Arq. Mario Gutiérrez Mendoza
 Supervisor de Obras por la UAAAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OBRA	PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.	CONTRATO 027/22/AD Mto		
Clave	Concepto	unidad	cantidad	Importe
	RETIRO DE BASES DE CONCRETO Y TRUENO EXISTENTE EN AREAS INDICADAS	ML	38	\$11,400.00

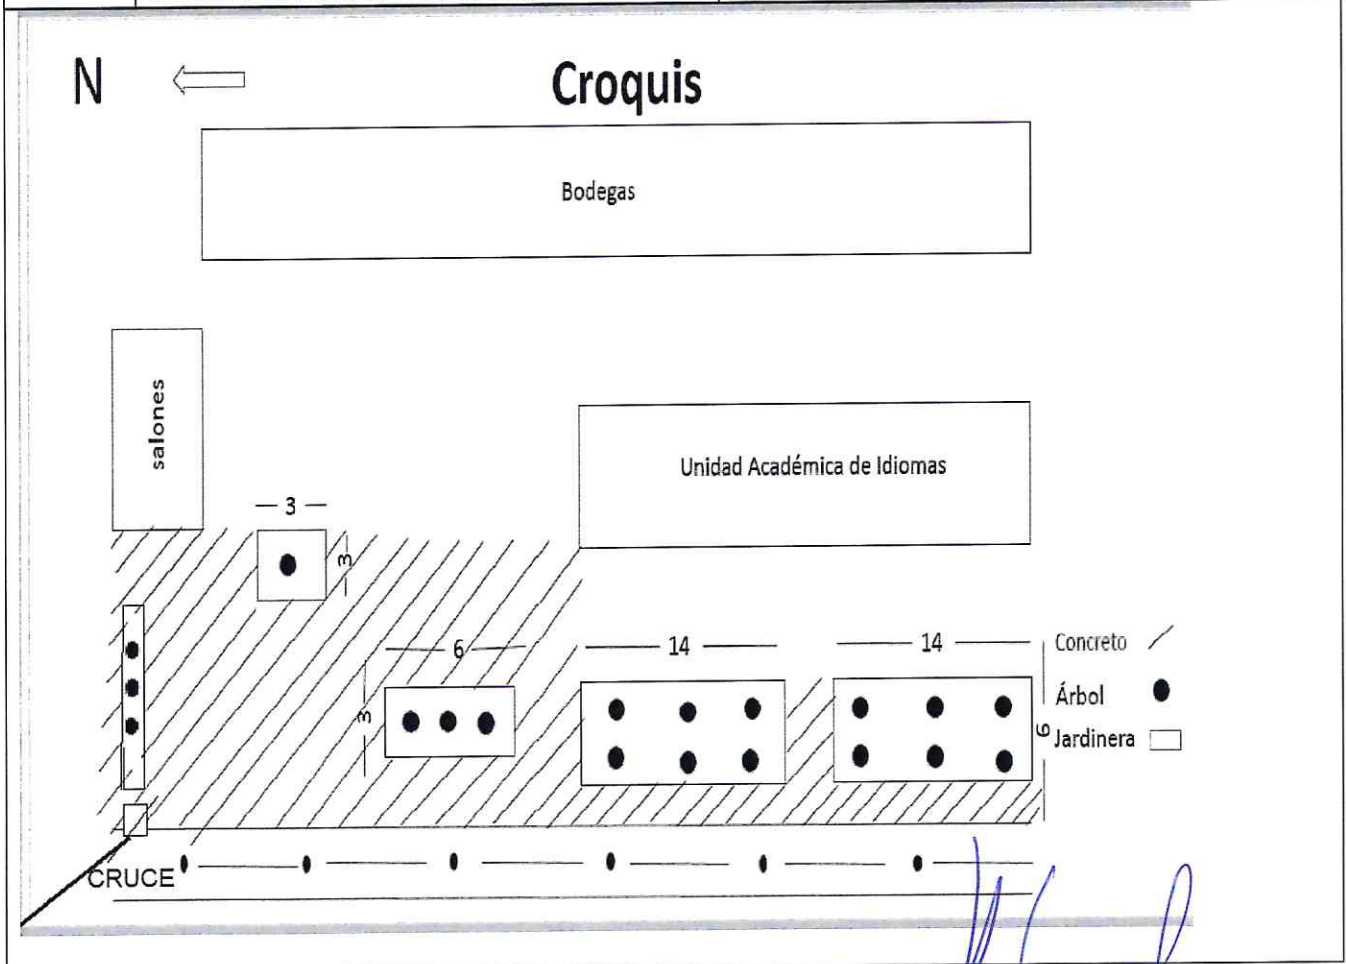


Ing. Marco Antonio Martínez Salas
 Servicios y Construcciones Glomarsa, S.A. de C.V.

[Handwritten signature]

Arq. Mario Gutiérrez Mendoza
 Supervisor de Obras por la UAAAN

[Handwritten signature]


OBRA	PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.	CONTRATO 027/22/AD Mtto		
Clave	Concepto	unidad	cantidad	Importe
	ADECUAR Y FABRICAR JARDINERAS DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 SIMILAR A EXISTENTES ACABADOS CERROTADO Y BASE DE CONCRETO ARAMADA, ACABADO PINTURA OCRE ESMALTE,EXCAVACIÓN, ENRACE, MURO DE BLOCK, CASTILLO, CERROTEADO ESTRUCTURAL, BASE DE CONCRETO ACABADO PINTURA OCRE.	ML	175	\$113,750.0

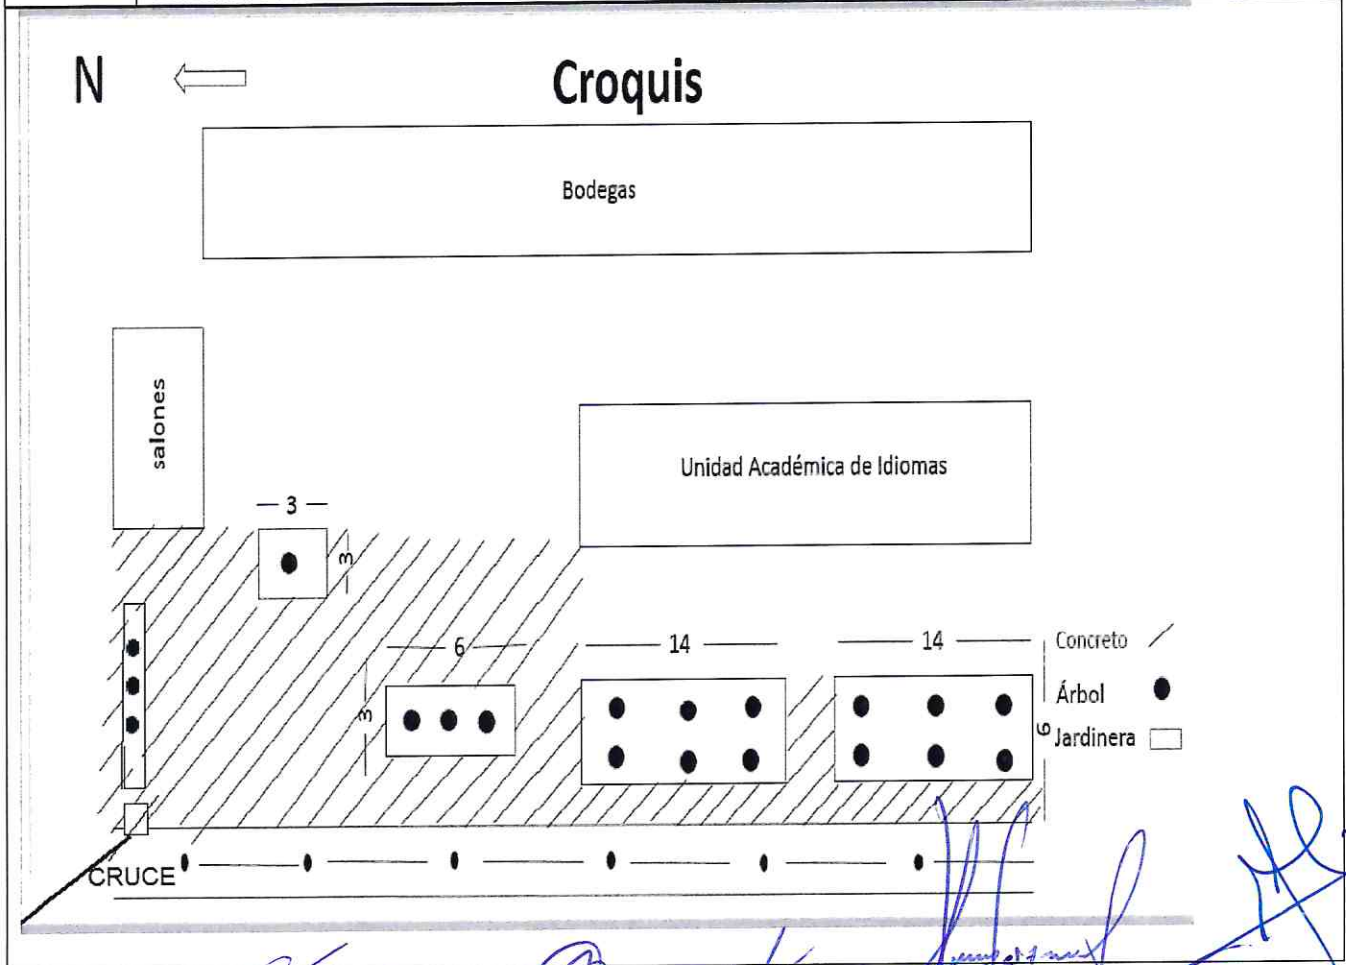

Ing. Marco Antonio Martínez Salas
Servicios y Construcciones Glomarsa, S.A. de C.V.

Arq. Mario Gutiérrez Mendoza
Supervisor de Obras por la UAAAN


OBRA	PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.	CONTRATO 027/22/AD Mtto		
Clave	Concepto	unidad	cantidad	Importe
	COLECTOR PLUVIAL DE REJILLA METALICA 18 MTS LINEALES EN CANAL DE CONCRETO PARA CRUCE DE CALLE Y TUBO DE PVC DE 6" A JARDÍN O REGISTRO SANITARIO.	ML	18	\$12,600.00

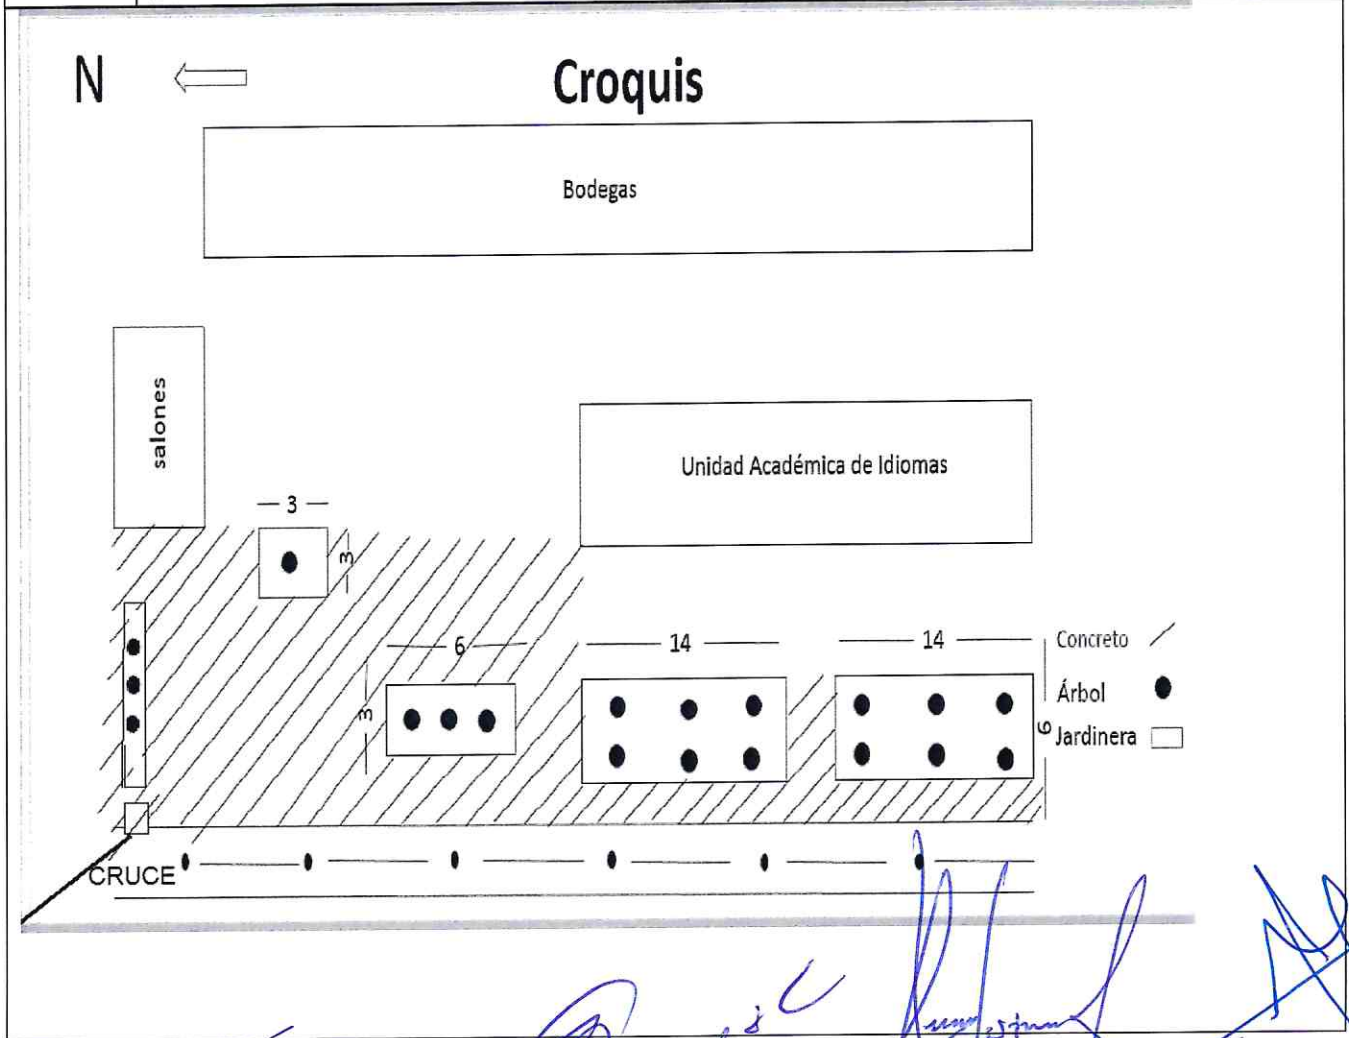

Ing. Marco Antonio Martínez Salas
 Servicios y Construcciones Glomarsa, S.A. de C.V.

Arq. Mario Gutiérrez Mendoza
 Supervisor de Obras por la UAAAN

OBRA	PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.	CONTRATO 027/22/AD Mtto		
Clave	Concepto	unidad	cantidad	Importe
	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TIERRA EN ACCESO PRINCIPALES Y ANDADOR.	M2	200	\$16.000.00

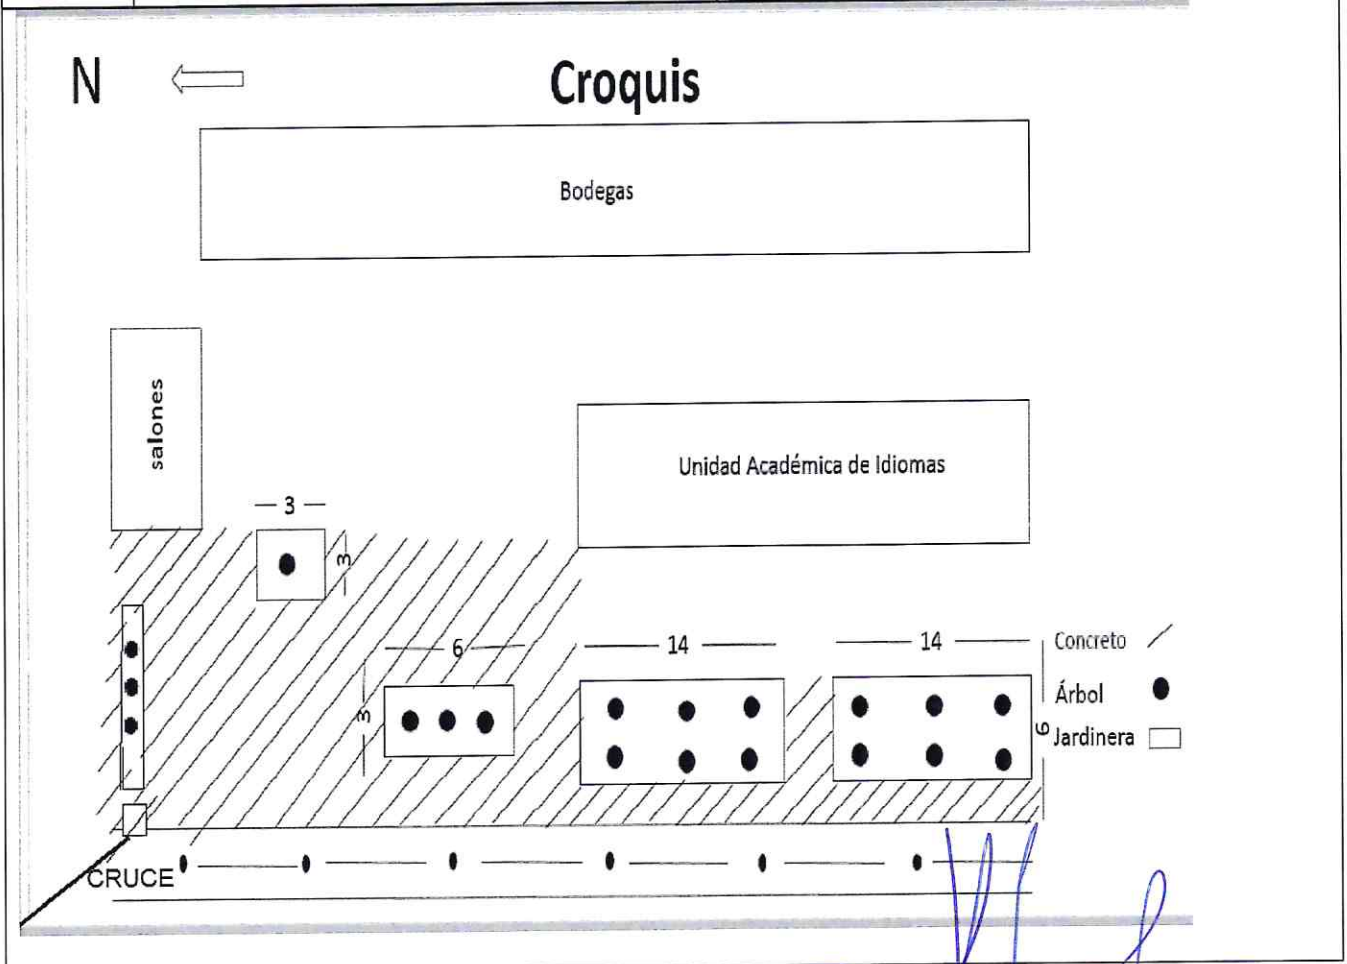


Ing. Marco Antonio Martínez Salas
 Servicios y Construcciones Glomarsa, S.A. de C.V.

Arq. Mario Gutiérrez Mendoza
 Supervisor de Obras por la UAAAN

[Handwritten signatures in blue ink]

OBRA	PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.	CONTRATO 027/22/AD Mtto		
Clave	Concepto	unidad	cantidad	Importe
	FIRME DE CONCRETO F" C=150 KG/CM DE 10CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10. ACABADO PULIDO Y CUADROS, VOLTEADORA EN JUNTAS INCLUYE: NIVELACIÓN CIMBRADO, VACEADO, DESIMBRADO Y CURADO.	M2	450	\$171,00.00

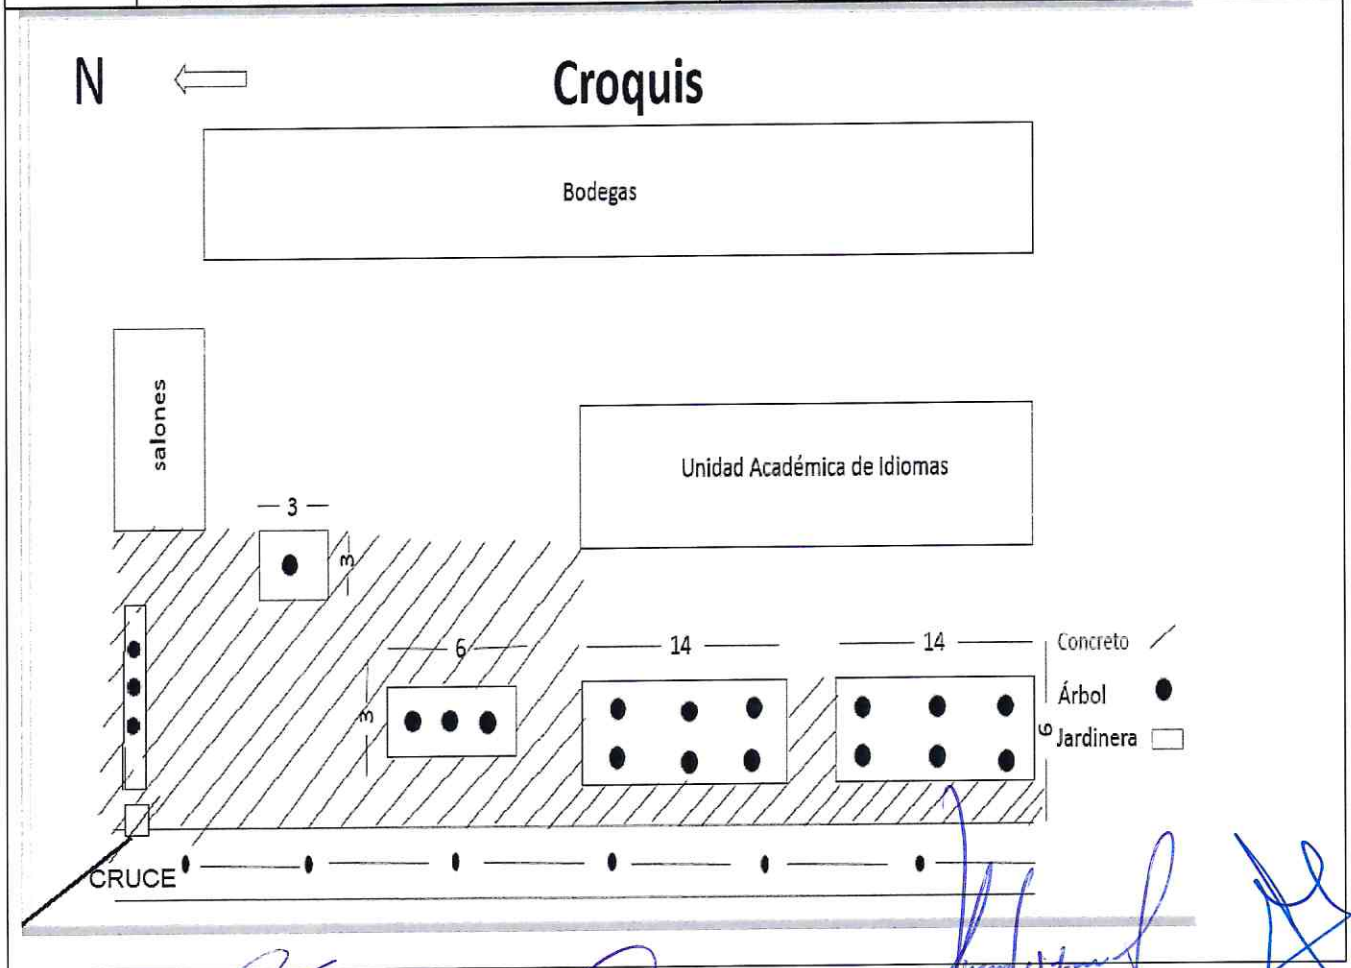

Ing. Marco Antonio Martínez Salas
 Servicios y Construcciones Glomarsa, S.A. de C.V.

Arq. Mario Gutiérrez Mendoza
 Supervisor de Obras por la UAAAN

OBRA	PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.	CONTRATO 027/22/AD Mtto
------	---	-------------------------

RESUMEN FOTOGRAFICO




Ing. Marco Antonio Martínez Salas
 Servicios y Construcciones Glomarsa, S.A. de C.V.

[Handwritten signature]
Arq. Mario Gutiérrez Mendoza
 Supervisor de Obras por la UAAAN



OBRA	PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.	CONTRATO 027/22/AD <u>Mtto</u>
------	---	--------------------------------

RESUMEN FOTOGRAFICO

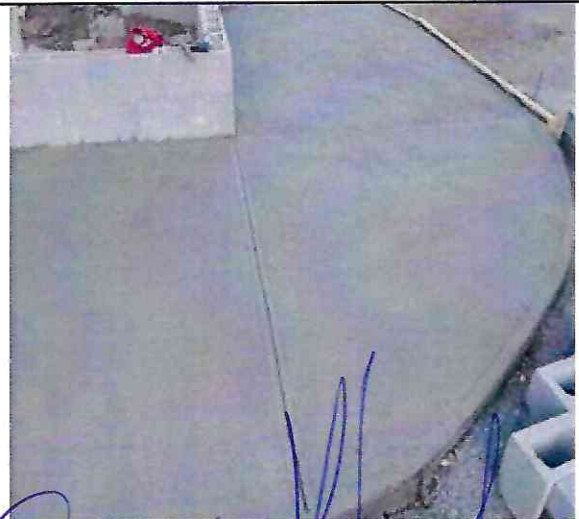

Ing. Marco Antonio Martínez Salas
 Servicios y Construcciones Glomarsa, S.A. de C.V.

Arq. Mario Gutiérrez Mendoza
 Supervisor de Obras por la UAAAN

(Handwritten signatures in blue ink)

OBRA	PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.	CONTRATO 027/22/AD Mtto
------	--	--------------------------------

RESUMEN FOTOGRAFICO



Ing. Marco Antonio Martínez Salas
 Servicios y Construcciones Glomarsa, S.A. de C.V.

Arg. Mario Gutiérrez Mendoza
 Supervisor de Obras por la UAAAN

OBRA	PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.	CONTRATO 027/22/AD Mtto
------	--	--------------------------------

RESUMEN FOTOGRAFICO




Ing. Marco Antonio Martínez Salas
 Servicios y Construcciones Glomarsa, S.A. de C.V.

Resumen




Arq. Mario Gutiérrez Mendoza
 Supervisor de Obras por la UAAAN

OBRA	PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE JARDINERAS Y ANDADOR EN ÁREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.	CONTRATO 027/22/AD Mtto
------	---	-------------------------

RESUMEN FOTOGRAFICO

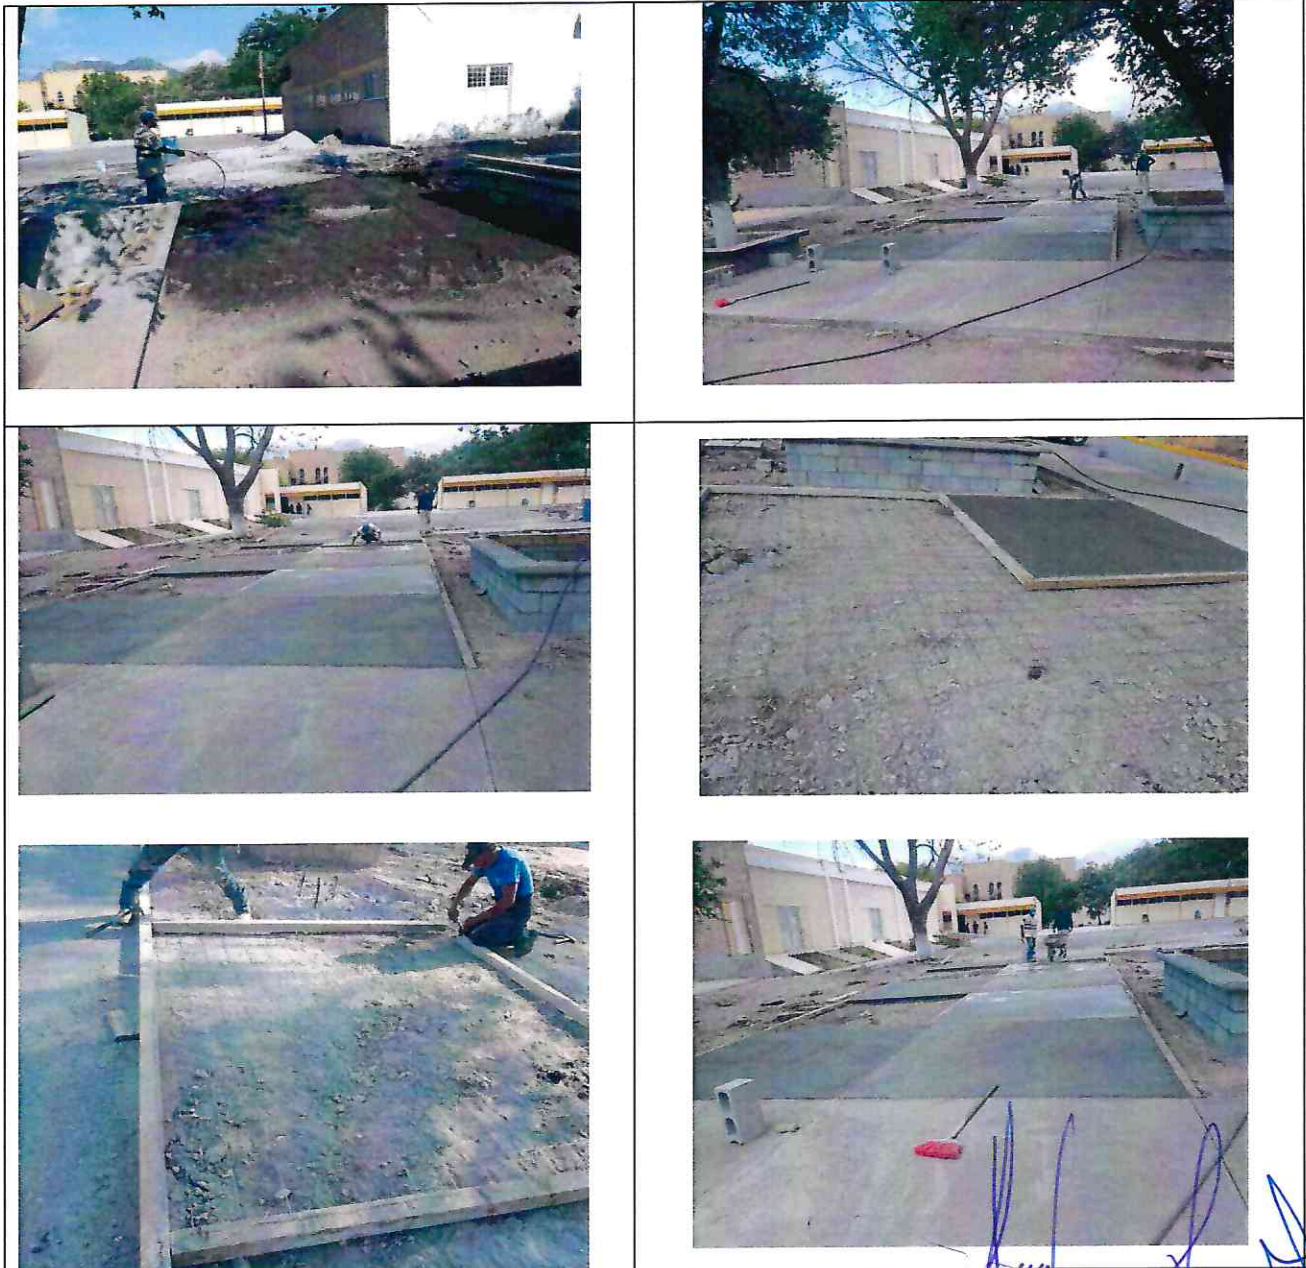


Ing. Marco Antonio Martínez Salas
 Servicios y Construcciones Glomarsa, S.A. de C.V.

  
Arq. Mario Gutiérrez Mendoza
 Supervisor de Obras por la UAAAN

11 ABRIL 2022

01

CON ESTA FECHA SE DIÓ COMO INICIADA,
LA OBRA: ADECUACION DE JARDINERAS
Y ANDADORES EN AREA PEATONAL DE AULAS
DE IDIOMAS.

SE RETINARON BACES DE CONCRETO EXISTENTE
EN EL AREA PEATONAL, DONDE SE IVA
REALIZAR LOS TRABAJOS


12 ABRIL 2022

SE PROCEDEO AL RETIRO DE TRUENOS
EXISTENTES EN AREAS PEATONALES DEL
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS, DONDE SE
REALIZARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES


15 ABRIL 2022

SE HICU LIMPIEZA EN EL AREA PARA
EMPEZAR EN EL TRABAJO

Ing. Manco M. S.
C. I. O. M. A. S. A.

Ana María C. G.




18 / ABRIL / 2022

02

SE PROCEDIO AL TIRAR Y NIVELACION DE
TERRENO EN AREA DE EDIFICIO PARA
LA ELABORACION DE JARDINERA EN DICHA
AREA

19 / ABRIL / 2022

SE EMPLEO CON LA CIMENTACION DE
JARDINERA PARA CANTADO DE BLOQUE
SE ADE INSTALO VANILLA 3/4 CUADA 1 ml
PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO

21 / ABRIL / 2022

SE EMPLEO LA INSTALACION DE BLOQUE DE
15 X 20 X 40 cm, INSTALANDO TRES FILAS
PARA DAR NIVEL SATISFACTORIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION QUEDANDO TERMINADA
DUS JARDINERAS

Ing MANCUMANES
CILOMATA

Ing. MARIO CIL
(Signature)

(Signatures)

22 / ABRIL / 2022

03

SE PROCEDIO AL ARMADO DE LOSA DE JARDINERA CON VANILLA DE 3/8 Y BASTONES CADA 2 ML

23 / ABRIL / 2022

SE REALIZO BACIADO DE LOSA DE JARDINERA QUEDANDO SATISFACTORIAMENTE EN AÑER DE IDIOMAS


25 / ABRIL / 2022

SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE OTRAS 3 JARDINERAS, SE HICIO LA CIMENTACION DE LAS 3 JARDINERAS Y SE INSTALO LAS VANILLAS 3/8 C CADA 1 ML


26 / ABRIL / 2022

SE PROCEDIO A LA INSTALACION DE BLOCK DE 15X20X40 QUEDANDO TERMINADO

FNG MANCO A. MIZ
CICOMARSA


ANO MARZO CTS







27 / ABRIL / 2022

04

SE PROCEDIÓ A LA INSTALACIÓN, DE LA LOSA DE CONCRETO DANDO POR TERMINADA LAS JARDINERAS CORRESPONDIENTES

29 / ABRIL / 2022

SE PROCEDIÓ A DAR ACABADO A JARDINERAS CON UN ACABADO CEMENTADO, ARENA, CEMENTO GRABA, PARA DAR UNA BUENA TERMINACIÓN

30 / ABRIL / 2022

SE PROCEDIÓ A PINTAR LOSA DE JARDINERAS PARA DAR UN MEJOR ACABADO, PARA DAR UNA BUENA PRESENTACIÓN, SE HIZO LIMPIEZA EN ÁREA DE JARDINERAS, PARA LA INSTALACIÓN DE TIERRA EN ÁREAS DE JARDINERAS DE FIDIAS

ING. MARCO A. MIZ
GLIMARISA

ARQ. MARIO GIZ

02 / MAYO / 2022

SE PROCEDIO A LIMPIEZA DE REGISTROS EXISTENTES EN AREA PEATONAL EN AREA DE FIDUCIAS Y SE LIMPIARON

03 / MAYO / 2022

SE PROCEDIO A LA NIVELACION DE TAPAS DE REGISTRO PARA SU MEJOR INSTALACION QUEDANDO SATISFACTORIAMENTE

06 / MAYO / 2022

SE PROCEDIO AL RELLENO Y COMPACTACION EN AREA DE FIDUCIAS, PARA SU NIVELACION PARA LA REALIZACION DE BANQUETAS PARA SU CORRECTA ELABORACION Y SO ACARREO ESCOMBRO SOBANTE

10 / MAYO / 2022

SE EMPEZO CON LA REALIZACION DE BANQUETAS DE CONCRETO CON FIC 130 CON MALLA ELECTROVODADA

Ing. Marco A. Mtz
CLOMANSA

And. Mario Cita





16 / MAYO / 2022

SE CONTINUO CON LA REALIZACION DE BANQUETAS DE CONCRETO FIC 150 CON MALLA ELECTRODUCIDA EN AREA VEHICULAR PARA SU MEJOR RESISTENCIA

20 / MAYO / 2022

SE REALIZO LA ESCAVACION PARA LA REALIZACION DE COLECTOR PIVVIAL CON REDILLO DE 18cm

23 / MAYO / 2022

SE REALIZO CAUCE PARA LA INSTALACION DE DRENAJE PIVVIAL CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE COMPACTO Y SE REALIZO EL ACABADO EN PAVIMENTO PARA MEJOR SATISFACCION EN AREA DE

IDUOMAS

Ing. ~~Mano A~~ Mtb
GLOMANSA

AND MARZO CIL

~~Mano A~~

~~AND MARZO CIL~~


23 / MAYO / 2022

SE REALIZO LA ELABORACION DE CANAL DE CONCRETO, CON REJILLA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN ARE DE IDIOMAS


24 / MAYO / 2022

SE REALIZO LIMPIEZA A TODA LA AREA DE IDIOMAS X ASI DAMOS POR TERMINADA LA OBRA

Ing. MARCO ANTONIO
CILUMANSÁ



Arq. 
MARIO C. H.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	027/22/AD/MTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	11/04/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	24/05/2022
DESCRIPCION	ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.		
CONTRATISTA	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V.		
MONTO DEL CONTRATO	\$387,846.00	FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO		FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.
	\$387,846.00		\$387,846.00
			PERIODO DE EJECUCION
			DEL 11 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2022
SUMATORIA	\$387,846.00		
OBSERVACIONES			
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES			
FIRMA DEL USUARIO: M.C. ANA MARIA FUENTES TORRES.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS.			
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V., ING. JUAN ANGEL GALVAN LEDEZMA.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	027/22/AD/IMTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	11/04/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	24/05/2022
DESCRIPCION	ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.		
CONTRATISTA	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V.		
MONTO DEL CONTRATO	\$387,846.00	FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO		FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.
	\$387,846.00		\$387,846.00
			DEL 11 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2022
SUMATORIA	\$387,846.00		\$387,846.00
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES			
FIRMA DEL USUARIO: M.C. ANA MARIA FUENTES TORRES.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS.			
SUPERVISOR		SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	
		SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V., ING. JUAN ANGEL GALVAN LEDEZMA.	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	027/22/AD/MTTO.		FECHA INICIO PROGRAMADA	11/04/2022
NUMERO CONVENIO			FECHA TERMINO PROGRAMADA	24/05/2022
DESCRIPCION	ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.			
CONTRATISTA	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V.			
MONTO DEL CONTRATO	\$387,846.00	TOTAL DE LA OBRA.	DEL 11 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2022	
MONTO DEL CONVENIO				
ESTIMACIONES:				
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	PERIODO DE EJECUCION	
	\$387,846.00		DEL 11 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2022	
SUMATORIA	\$387,846.00			

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

OBSERVACIONES

FIRMA DEL USUARIO: M.C. ANA MARIA FUENTES TORRES.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS.

SUPERVISOR		SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO		CONTRATISTA	
ING. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V., ING. JUAN ANGEL GALVAN LEDEZMA.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

LISTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra





NUMERO CONTRATO	027/22/AD/MTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	11/04/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	24/05/2022
DESCRIPCION	ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.		
CONTRATISTA	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V.		
MONTO DEL CONTRATO	\$387,846.00	FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO		FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.
	\$387,846.00		\$387,846.00
			DEL 11 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2022
SUMATORIA	\$387,846.00		\$387,846.00
OBSERVACIONES			
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES			
FIRMA DEL USUARIO: M.C. ANA MARIA FUENTES TORRES.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS.			
SUPERVISOR		SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V., ING. JUAN ANGEL GALVAN LEDEZMA.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	027/22/AD/MITTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	11/04/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	24/05/2022
DESCRIPCION	ADECUACION DE JARDINERAS Y ANDADOR EN AREA PEATONAL DE AULAS E IDIOMAS.		
CONTRATISTA	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V.		
MONTO DEL CONTRATO	\$387,846.00	FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO		FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAAA	TOTAL DE LA OBRA.
	\$387,846.00		\$387,846.00
			DEL 11 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2022
SUMATORIA	\$387,846.00		\$387,846.00
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES			
FIRMA DEL USUARIO: M.C. ANA MARIA FUENTES TORRES.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS.			
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
 ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	 ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	 ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	 SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA, S.A. DE C.V., ING. JUAN ANGEL GALVAN LEDEZMA.
