



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-08-00557**

Elab :2022-08-23

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO - FACTURA NO. A-214 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN EL JARDIN DE ACCESO A LA UAAAN, BANQUETAS INTERIORES LADO SUR, TERCERA ETAPA CONTRATO NO. 047/22 AD. MTTO. MONTO TOTAL \$ 305,370.00

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	3	PAG	1991	JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO	\$ 305,370.00	
5135-1000	PAR	3510100	PAG	1991	FACTURA NO. A-214/SOL.MTTO.1168 TRABAJOS DE REMOD. DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN JARDIN	\$ 305,370.00	
1112-1101	BCO	SA-BNMX25			(PD 1991 DEP) JAVIER ARMANDO SORIA - FACTURA NO. A-214 TRABAJOS DE		\$ 305,370.00
2112-1000	PRV	3	PAG	1991	FACTURA NO. A-214/SOL.MTTO.1168 TRABAJOS DE REMOD. DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN JARDIN		\$ 305,370.00
TOTALES POLIZA						\$ 610,740.00	\$ 610,740.00


Elaboró


Revisó

Vo.Bo.

B-08-557
3533



Miércoles 17 de Agosto del 2022, 11:40:59 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 5812607
Razón Social UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **166545**.

Autorizadores Usuario 02 CARLOS MONSIVAIS LEIJA

Cuentas

Cuenta retiro
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRAR - 4484/6643

Cuenta de depósito o beneficiario
BANORTE - MXN *****066 Nombre: JAVIER SORIA ANGUIANO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 305,370.00
Referencia Numérica	1991
Concepto del pago	PGO FAC A214 SORIA ANGUIANO JAVIER
Clave de rastreo	085901665454322922
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	17/08/2022

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO. COAH.

01 (844) 411-0200


UAA750303NHA

Beneficiario 3

JAVIER ARMANDO SORIANO ANGULANO

No.2226

Factura	Descripción	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
A-214	PAGO DIRECTO DOCUMENTO 1991	305,370.00	0.00	0.00	305,370.00
TOTALES					305,370.00


UAAAN
 15 DE AGOSTO DE 2022
RECIBIDO
 FRANCISCO DOMÍNGUEZ

TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2022

PAGO DIRECTO

FORMATO: F-7.14-1



Imprimir



DOCUMENTO No. 1991

PAGO DIRECTO

PENDIENTE

Entidad Federativa :

5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2022-06-21

Región :

5 -

Liberado :

Municipio :

30 - SALTILLO

Autorizado :

Finalidad :

25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable :

410302001 -

Sub Programa :

4151 - Mantenimiento de Obra de Interes General

Solicitante

1516-MANDUJANO ALVAREZ JOSE ENRIQUE

Concepto

FACTURA NO. A-214 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN EL JARDIN DE ACCESO A LA UAAAN, BANQUETAS INTERIORES LADO SUR, TERCERA ETAPA CONTRATO NO. 047/22 AD. MTTO. MONTO TOTAL \$ 305,370.00

BENEFICIARIO

PRV-3 : JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO ✓

Cuenta Bancaria

Part.	Descripción de la Partida	Importe
3510100	FACTURA NO. A-214/SOL.MTTO.1168 TRABAJOS DE REMOD. DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN JARDIN	\$ 305,370.00 ✓
	TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO	\$ 305,370.00 ✓



ARQ. JAVIER ARMANDO SORIA ✓
ANGUIANO
 RFC: SOAJ551031HS2
 Régimen Fiscal: 612

FACTURA: **A 214** ✓
Fecha: **2022-06-17T23:00:13**
Tipo De Comprobante: 1 ✓
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000501123427
Lugar de Expedición: 25000

RECEPTOR:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO RFC: UAA750303NHA ✓
 Uso CFDI: G03

Moneda: MXN	Forma de Pago: 03	Método de Pago: PUE
-----------------------	-----------------------------	-------------------------------

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1		E48		60141006	263,250.0000	263,250.0000
Descripción: PAGO FINIQUITO DE TRABAJOS DE REMODELACION DE PISO CONCRETO Y PLAZA EN JARDIN DE ACCESO A LA UAAAN BANQUETAS INTERIORES LADO SUR TERCER ETAPA, CON No DE CONTRATO 047-22 AD.MTTO						

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	263250.0000	002	Tasa	0.160000	42,120.00

Importe en letra:
 Trescientos Cinco Mil Trescientos Setenta Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: **263,250.00**
IVA 16%: **42,120.00**
Total: **305,370.00** ✓



Número de Serie del Certificado:
 00001000000503726537
Fecha y hora de Certificación:
 2022-06-17T23:03:56
RFC Proveedor de Certificación:
 DET080304395
UUID:
 0B4E2978-89FB-43F0-860B-01B56DC5AC75

Sello CFD: B8P6vByFPHWeCrcIuYnmHCFfDTQ2uk4BPxfSIzoggSbDmKx7bxAU5K1ITTO/gYMO7TaSUC2MD3cWqpvBG4hv7ZZVNYLS98PcJaNB/jGCHc4ptGQWERH3vs75Rb5u0L2Mg/+flFeo0w+ams98xRFye8NvnX4jSBjBFCfkJm0XsHy3qSNy/D+pu1CaqEnoF/9vc6OmRm7YAr07D6RUp14/9uIK0IEZZmC6wxw0kURurYse5Ffo7AA1i/76FobxmiOmV5LA6Qpear20burlye06GibrG7gVGfUFbaQL9HS1GewtvS7krTabW+hi3kq0Zgth38FXyDw3k0gaekCWrMw==

Sello SAT: DyX9+hrDwZ10/+5ydc1Nj31fk1/PDwdaxe/t7JNCFWt9wWPVvoFc33mFvgjP4q0J2bZfOjz8NFOE6sJ5sR8SoP+rIWM8T9dlOwSnSdq/6LcyMSeYVfzyFehVB64bcAfbFIL2XynvpEOKKa72/REAYWpOLGwp2XK17c2JpcvshtVP0kagnc65D6BI7NDeKJpWV6kFVnOjChySIAR+aOQ1uGxWcDAOFmaD+N/18ZXtY24qpLH/C/sT+x4tmuKxc6YH8ojYvNnOB5D5u5wXVOiRq6oJdh3DJlUUGktQluutq7/elpuV8J+cMpuCyNbOKFoM6yrh+9HBsvcl6JfSA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|0B4E2978-89FB-43F0-860B-01B56DC5AC75|2022-06-17T23:03:56|DET080304395|B8P6vByFPHWeCrcIuYnmHCFfDTQ2uk4BPxfSIzoggSbDmKx7bxAU5K1ITTO/gYMO7TaSUC2MD3cWqpvBG4hv7ZZVNYLS98PcJaNB/jGCHc4ptGQWERH3vs75Rb5u0L2Mg/+flFeo0w+ams98xRFye8NvnX4jSBjBFCfkJm0XsHy3qSNy/D+pu1CaqEnoF/9vc6OmRm7YAr07D6RUp14/9uIK0IEZZmC6wxw0kURurYse5Ffo7AA1i/76FobxmiOmV5LA6Qpear20burlye06GibrG7gVGfUFbaQL9HS1GewtvS7krTabW+hi3kq0Zgth38FXyDw3k0gaekCWrMw==|00001000000503726537||



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**Comité de Obras y Servicios Relacionadas
con las mismas**

Calzada Antonio Narro 1923, Colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 4110200 ext. 2014. Tel.dir (844) 411 02 08
e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx - Página Web: www.uaaan.edu.mx



Saltillo, Coah. A 17 de junio de 2022

CONSTANCIA

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor **JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO.**, en cumplimiento al contrato **047/22 AD. MTTO. TRABAJOS DE REMODELACION DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN EL JARDÍN DE ACCESO A LA UAAAN, BANQUETAS INTERIORES LADO SUR TERCERA ETAPA,** y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el cumplimiento, vicios ocultos y Anticipo de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 00232198506

Cheque Número: 0002033

Cantidad: \$26,325.00 (veinticinco mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de Vicios Ocultos.

Cheque Número: 0002034

Cantidad: \$26,325.00 (veinticinco mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de cumplimiento.

Oficina:

Sucursal: 0066, Cd. Saltillo, Coah. Poniente

Titular de la cuenta: JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados cuando haya concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

**ATENTAMENTE
ALMA TERRA MATER**

**M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y PRESEIDENTE DEL COySRM**

Ccp. Archivo

JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO

BANORTE

2 V 3063459
SOAJ551031HS2

SALTILLO, COAHUILA

FECHA:

JUNIO-17-2022

\$ 26,325.

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA ARARIA ANTONIO NARRO

VEINTISEIS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL

250113
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0066 SALTILLO PONIENTE
CTA 023219850-6

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

0634:511590723:00232198506:0002033

JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO

BANORTE

2 V 3061759
SOAJ551031HS2

SALTILLO, COAHUILA

FECHA:

JUNIO-17-2022

\$ 26,325.

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA ARARIA ANTONIO NARRO

VEINTISEIS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL

250113
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0066 SALTILLO PONIENTE
CTA 023219850-6

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

9543:511590723:00232198506:0002034

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Rangel".

Arq. Javier Armando Soria Anguiano

Xicoténcatl No. 556 - 5

Zona Centro

CP 25000

Tel. 4 10 21 71

Saltillo Coahuila

RFC SOAJ551031HS2

arjaviadorsoria@yahoo.com

SALTILLO COAHUILA A 17 DE JUNIO DEL 2022

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
PRESENTE.-

ATTN. ING. GUSTAVO BURCIAGA

Jefe del departamento de Obras y Mantenimiento.

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO", LA CANTIDAD DE \$305,370.00 (TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN JARDÍN DE ACCESO A LA UAAAN, BANQUETAS INTERIORES LADO SUR (TERCERA ETAPA) CON NO. DE CONTRATO 047/22 AD.MTTO.

ATENTAMENTE

ARQ. JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO



JUAN ANTONIO MERCADO RODRIGUEZ
A R Q U I T E C T O

NAVIA No. 312 COL. ASTURIAS CP 25107
TELEFONO 844 4397427
CORREO ELECTRONICO ARQ.MERCADO2007@YAHOO.COM.MX

SALTILLO, COAHUILA
TEL.CELULAR 844 5 32 69 48
RF MERJ610713DP2

Saltillo Coahuila a 20 de Mayo del 2022.

Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro"
Domicilio conocido Buenavista
Saltillo Coahuila
Presente . _

Presupuesto para la construcción de piso de concreto estampado y plaza en jardín de acceso a la
UAAAN.

Banquetas , pasillos interiores lado sur.

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
I	ALBAÑILERIA				
1	Despalme de terreno.	M2	282.00	62.00	17,484.00
2	Nivelación de terreno.	M2	282.00	85.00	23,970.00
3	Relleno y compactación de terreno.	M2	282.00	185.00	52,170.00
4	Vaciado de piso de concreto estampado 8 cm de espesor.	M2	282.00	620.00	174,840.00
5	Retiro de escombros.	LOTE	1.00	19,000.00	19,000.00
				SUBTOTAL	287,464.00
				I.V.A.	45,994.24
				TOTAL	333,458.24

(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 24/100 M. N.)

ATENTAMENTE

ARQ. JUAN ANTONIO MERCADO RODRIGUEZ



JUAN MARTIN MORELOS MARTINEZ
arquitecto

Bravo sur 528
Centro Histórico
Saltillo Coahuila CP 25000

RF MOMJ661107

Tel. 412 71 64
Cel. 844 329 69 74
marqui_mm@hotmail.com

Saltillo Coahuila a 20 de Mayo del 2022.

Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro"
Domicilio conocido Buenavista
Saltillo Coahuila
Presente . _

Presupuesto para la construcción de piso de concreto estampado y plaza en jardín de acceso a la UAAAN.

Banquetas , pasillos interiores lado sur.

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
/	ALBAÑILERIA				
1	Despalme de terreno.	M2	282.00	55.00	15,510.00
2	Nivelación de terreno.	M2	282.00	75.00	21,150.00
3	Relleno y compactación de terreno.	M2	282.00	178.00	50,196.00
4	Vaciado de piso de concreto estampado 8 cm de espesor.	M2	282.00	615.00	173,430.00
5	Retiro de escombros.	LOTE	1.00	18,500.00	18,500.00
				SUBTOTAL	278,786.00
				I.V.A.	44,605.76
				TOTAL	323,391.76

(TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 76/100 M. N.)

ATENTAMENTE

ARQ. JUAN MARTIN MORELOS MARTINEZ



Arq. Javier Armando Soria Anguiano

Xicoténcatl No. 556 - 5
Saltillo Coahuila

Zona Centro CP 25000
RFC SOAJ551031HS2

Tel. 4 10 21 71
arjaviadorsoria@yahoo.com

SALTILLO COAHUILA A 25 DE MAYO DEL 2022

**UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
BUENAVISTA SALTILLO COAHUILA
PRESENTE.-**

**AT'N ING. GUSTAVO BURCIAGA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS Y MTTO.**

ME REFIERO A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN JARDIN DE ACCESO A LA UAAAN, BANQUETAS INTERIORES LADO SUR (TERCERA ETAPA) CON NO. DE CONTRATO 047/22 AD.MTTO.

SOBRE LO ANTERIOR POR ESTE CONDUCTO COMUNICO A USTEDES QUE CON ESTA FECHA DIMOS INICIO A LA EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS.

SIN MAS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA QUEDAR A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

ARQ. JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO



Arq. Javier Armando Soria Anguiano

Xicoténcatl No. 556 - 5
Saltillo Coahuila

Zona Centro
RFC SOAJ311055HS2

CP 25000

Tel. 4 10 21 71

arjaviadorsoria@yahoo.com

SALTILLO COAHUILA A 11 DE JUNIO DEL 2022

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
BUENAVISTA SALTILLO COAHUILA
PRESENTE.-

AT N ING. GUSTAVO BURCIAGA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS Y MTTO.

ME REFIERO A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN JARDIN DE ACCESO A LA UAAAN, BANQUETAS INTERIORES LADO SUR (TERCERA ETAPA) CON NO. DE CONTRATO 047/22 AD.MTTO.

SOBRE LO ANTERIOR POR ESTE CONDUCTO COMUNICO A USTEDES QUE CON ESTA FECHA QUEDARON CONCLUIDOS DICHS TRABAJOS.

SIN MAS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA QUEDAR A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

ARQ. JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO

Arq. Javier Armando Soria Anguiano

Xicoténcatl No. 556 - 5

Zona Centro

Tel. 4 10 21 71

Saltillo Coahuila

Trabajos de remodelación de piso de concreto y plaza en el jardín de acceso a la UAAAN, banquetas interiores lado sur tercera etapa.



DESPLIEGUE DE TERRENO



NUOVA COTA DE TERRENO



RELLENO Y COMPACTACION

Arq. Javier Armando Soria Anguiano

Xicoténcatl No. 556 - 5

Zona Centro

Tel. 4 10 21 71

Saltillo Coahuila


Trabajos de remodelación de piso de concreto y plaza en el jardín de acceso a la UAAAN, banquetas interiores lado sur tercera etapa.



UNCIADO DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO



UNCIADO DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

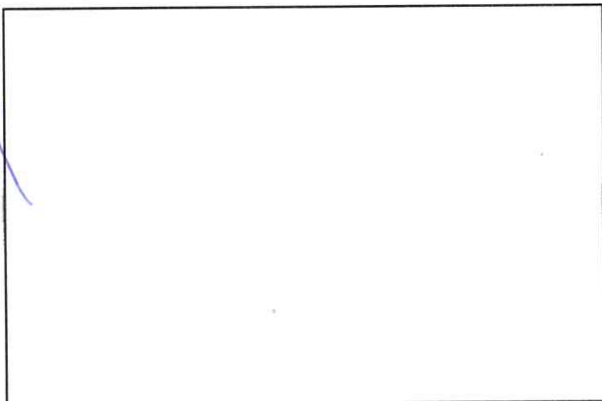

Fecha:

No.


Obra: Trabajos de remodelación de piso de concreto y plaza en jardines de acceso a la UAAAN y banquetas interiores lado sur 3^a etapa con número de contrato 041/22 ADMITTO

Ubicación de la obra:
Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro

Propietario de la obra: Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro

Supervisor: Arg René Casillas

Contratista: Arg Javier Armando
Soria Anguiano

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The signature appears to be 'Javier Armando Soria Anguiano'. The stamp is mostly illegible but contains some text and a date-like structure.

Fecha:

No.

Obra: Trabajos de remodelación de piso de concreto y plaza en jardín de acceso a la UAAAN y banquetas interiores lado sur 3^a etapa con número de contrato 047/22 ADMITTO

Ubicación de la obra:
Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro

Propietario de la obra: Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro

Supervisor: Arq René Casillas

Contratista: Arq Javier Armando
Soria Anguiano



Fecha:

No.

Obra: Trabajos de remodelación de piso de concreto y plaza en jardines de acceso a la UAAAU y banquetas interiores lado sur 3^{er} etapa con número de contrato 047/22 ADU770

Ubicación de la obra:
Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro

Propietario de la obra: Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro

Supervisor: Arq René Casillas

Contratista: Arq Javier Armando
Soria Anguiano



Fecha:

No.


Semana del 25 al 28 mayo 2022

El día 25 de mayo se da inicio a los trabajos del presente contrato. En este contrato se me había indicado con anterioridad que se haría una banqueta de concreto estampado de la explanada central hacia el lado ote del terreno.

Este día de inicio estuvo presente el Arg René Casillas, supervisor de la obra, indicándome que la banqueta antes mencionada se construiría de la explanada central hacia el lado pte. del terreno para conectarla con la banqueta de la avenida principal existente.

Esta semana se realizó el despalme, relleno, nivelación y compactación del terreno de la banqueta antes mencionada.

Arg



Fecha:

No.:

Semana del 25 al 28 mayo 2022

El día 25 de mayo se da inicio a los trabajos del presente contrato. En este contrato se me había indicado con anterioridad que se haría una banqueta de concreto estampado de la explanada central hacia el lado ote del terreno.

Este día de inicio estubo presente el Arq René Casillas, supervisor de la obra, indicándome que la banqueta antes mencionada se construiría de la explanada central hacia el lado pte. del terreno para conectarla con la banqueta de la avenida principal existente.

Esta semana se realizó el despalme, relleno, nivelación y compactación del terreno de la banqueta antes mencionada.

C.O.

Fecha:

No.

Semana del 25 al 28 mayo 2022

El día 25 de mayo se da inicio a los trabajos del presente contrato. En este contrato se me había indicado con anterioridad que se haría una banqueta de concreto estampado de la explanada central hacia el lado ote del terreno.

Este día de inicio estuvo presente el Arg. René Casillas, supervisor de la obra, indicándome que la banqueta antes mencionada se construya de la explanada central hacia el lado pte. del terreno para conectarla con la banqueta de la avenida principal existente

Esta semana se realizó el des-palme, relleno, nivelación y compactación del terreno de la banqueta antes mencionada.

C/O

Fecha:

No.

se realizó también el vaciado de concreto estampado en esta sección

Semana del 30 mayo al 4 junio 2022
Esta semana se realizó el despalme, relleno, nivelación y compactación del andador interior lado sur-pte, partiendo del área de explanada central hasta la banqueta existente en el lado sur-pte, se efectuó también el vaciado de concreto estampado

[Signature]

Semana del 6 al 11 de junio 2022
Esta semana se realizó el despalme, relleno, nivelación y compactación del andador interior lado sur-pte, partiendo del área de la explanada central hasta la banqueta existente en el lado sur-pte del terreno

Fecha:

No.

se realizó también el vaciado de concreto estampado en esta sección

Semana del 30 mayo al 4 junio 2022
Esta semana se realizó el despalme, relleno, nivelación y compactación del andador interior lado sur-pte, partiendo del área de explanada central hasta la banqueta existente en el lado sur-pte, se efectuó también el vaciado de concreto estampado

~~Q
D~~

Semana del 6 al 11 de junio 2022
Esta semana se realizó el despalme, relleno, nivelación y compactación del andador interior lado sur-ote, partiendo del área de la explanada central hasta la banqueta existente en el lado sur-ote del Terreno

~~Q
D~~

Fecha:

No.

se realizó también el vaciado de concreto estampado en esta sección

Semana del 30 mayo al 4 junio 2022
Esta semana se realizó el despatado, relleno, nivelación y compactación del andador interior lado sur-pte, partiendo del área de explanada central hasta la banqueta existente en el lado sur-pte, se efectuó también el vaciado de concreto estampado

~~mi~~


Semana del 6 al 11 de junio 2022
Esta semana se realizó el despatado, relleno, nivelación y compactación del andador interior lado sur-pte, partiendo del área de la explanada central hasta la banqueta existente en el lado sur-pte del terreno

~~mi~~

Fecha:

No.

Se efectuó el vaciado de concreto estampado en el andador antes mencionado, concluyéndose los trabajos del presente contrato el día 11 de junio de 2022



Fecha:

No.

Se efectuó el vaciado de concreto es-
tampado en el andador antes men-
cionados, concluyendo los trabajos
del presente contrato el día
11 de junio de 2022



Fecha:

No.

Se efectuó el vaciado de concreto es-
tampado en el auditorio antes men-
cionados, concluyéndose los trabajos
del presente contrato el día
11 de junio de 2022



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	047/22/AD/MTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	25/05/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	15/06/2022
DESCRIPCION	TRABAJOS DE REMODELACION DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN JARDIN DE ACCESO A LA UAAAN, Y BANQUETAS INTERIORES LADO SUR, TERCERA ETAPA		
CONTRATISTA	ARQ. ARMANDO JAVIER SORIA ANGUIANO		
MONTO DEL CONTRATO	\$305,370.00	FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO		FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.
	\$305,370.00		\$305,370.00
			DEL 25 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2022
SUMATORIA	\$305,370.00		\$305,370.00

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

OBSERVACIONES

FIRMA DEL USUARIO:





SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
ARQ. RENE FRANCISCO CASILLAS MORALES	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	ARQ. ARMANDO JAVIER SORIA ANGUIANO.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	047/22/AD/MTTO.		FECHA INICIO PROGRAMADA	25/05/2022
NUMERO CONVENIO			FECHA TERMINO PROGRAMADA	15/06/2022
DESCRIPCION	TRABAJOS DE REMODELACION DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN JARDIN DE ACCESO A LA UAAAN, Y BANQUETAS INTERIORES LADO SUR, TERCERA ETAPA		FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	ARQ. ARMANDO JAVIER SORIA ANGUJANO		FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO	\$305,370.00			
MONTO DEL CONVENIO			FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES:				
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION
	\$305,370.00		\$305,370.00	DEL 25 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2022
SUMATORIA	\$305,370.00		\$305,370.00	
OBSERVACIONES				
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.				
FIRMA DEL USUARIO:				
SUPERVISOR	 ARQ. RENE FRANCISCO CASILLAS MORALES		SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
	 ING. GUSTAVO-ALFONSO BURCIAGA VERA		 ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	 ARQ. ARMANDO JAVIER SORIA ANGUJANO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	047/22/AD/MTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	25/05/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	15/06/2022
DESCRIPCION	TRABAJOS DE REMODELACION DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN JARDIN DE ACCESO A LA UAAAN, Y BANQUETAS INTERIORES LADO SUR, TERCERA ETAPA		
CONTRATISTA	ARQ. ARMANDO JAVIER SORIA ANGUIJANO		
MONTO DEL CONTRATO	\$305,370.00	FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO		FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.
	\$305,370.00		\$305,370.00
			DEL 25 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2022
SUMATORIA	\$305,370.00		\$305,370.00

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

OBSERVACIONES

FIRMA DEL USUARIO:

SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
ARQ. RENE FRANCISCO CASILLAS MORALES	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	ARQ. ARMANDO JAVIER SORIA ANGUIJANO.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	047/22/AD/MITTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	25/05/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	15/06/2022
DESCRIPCION	TRABAJOS DE REMODELACION DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN JARDIN DE ACCESO A LA UAAAN, Y BANQUETAS INTERIORES LADO SUR, TERCERA ETAPA		
CONTRATISTA	ARQ. ARMANDO JAVIER SORIA ANGUIANO		
MONTO DEL CONTRATO	\$305,370.00	FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO		FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA. PERIODO DE EJECUCION
	\$305,370.00		DEL 25 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2022
SUMATORIA	\$305,370.00		\$305,370.00
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES			
FIRMA DEL USUARIO:			
SUPERVISOR		SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	
ARQ. RENE FRANCISCO CASILLAS MORALES	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ.	ARQ. ARMANDO JAVIER SORIA ANGUIANO.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	047122/AD/MTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	25/05/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	15/06/2022
DESCRIPCION	TRABAJOS DE REMODELACION DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN JARDIN DE ACCESO A LA UAAAN, Y BANQUETAS INTERIORES LADO SUR, TERCERA ETAPA		
CONTRATISTA	ARQ. ARMANDO JAVIER SORIA ANGUIANO		
MONTO DEL CONTRATO	\$305,370.00	FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO		FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA. PERIODO DE EJECUCION
	\$305,370.00		DEL 25 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2022
SUMATORIA	\$305,370.00		\$305,370.00

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

OBSERVACIONES

FIRMA DEL USUARIO:

SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
ARQ. RENE FRANCISCO CASILLAS MORALES	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	ARQ. ARMANDO JAVIER SORIA ANGUIANO.



CONTRATO DE OBRA Y MANTENIMIENTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A LA QUE EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR EL MC. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y POR LA OTRA EL C. JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO, POR SUS PROPIOS DERECHOS, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. -" LA UNIVERSIDAD " DECLARA:

I. DECLARA "LA UNIVERSIDAD"

1. Que de conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Abril de 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que basada en el principio de su autonomía tiene como objetivos fundamentales: I. Impartir educación superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio crítico, humanista, democrático y nacionalista, capaces de contribuir a la solución de los problemas en el medio rural. II. Realizar investigación en las áreas científicas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y económico, integral, armónico e independiente tanto de la república y sus regiones como del estado, y III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología, en un proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.
2. Que en su representación comparece el **M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ**, en su carácter de **DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO** y apoderado general para actos de administración, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el DR. MARIO ERNESTO VAZQUEZ BADILLO, en su carácter de Rector de "LA UNIVERSIDAD", mediante instrumento público número (64) sesenta y cuatro, siendo las (09:00) nueve horas de fecha martes (25) veinticinco de Agosto de (2020) dos mil veinte, otorgado ante la fe del notario público número (127) ciento veintisiete, Lic. Demián Enrique Maldonado Pámanes.
3. Que la Universidad requiere la realización de la obra **TRABAJOS DE REMODELACION DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN EL JARDÍN DE ACCESO A LA UAAAN, BANQUETAS INTERIORES LADO SUR TERCERA ETAPA**
4. Que la Universidad cuenta con la suficiencia presupuestal, para cubrir la realización de la obra **TRABAJOS DE REMODELACION DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN EL JARDÍN DE ACCESO A LA UAAAN, BANQUETAS INTERIORES LADO SUR TERCERA ETAPA**, en los términos que se precisan en el anexo I del presente contrato.



5. Que la celebración del presente contrato se realizó por el Procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adjudicándose a **"EL CONTRATISTA"**, el contrato relativo a la realización de la obra TRABAJOS DE REMODELACION DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN EL JARDÍN DE ACCESO A LA UAAAN, BANQUETAS INTERIORES LADO SUR TERCERA ETAPA, que se precisan en el anexo I del presente contrato.
6. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.
7. Que tiene establecido su domicilio en el edificio de "La Dirección General Administrativa" ubicado en la Calzada Antonio Narro número 1923, colonia Buenavista, en Saltillo, Coahuila, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

Ramiro

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1. Que es una Persona Física con actividad empresarial, según su alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
2. Que tiene la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato con **"LA UNIVERSIDAD"**, y para ello cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con su objeto.
3. Que es una persona física que se encuentra en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el número **SOAJ551031H52**.
4. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ninguno de los dueños o directivos de **"EL PROVEEDOR"**, se encuentra desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlos y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo.
5. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará el **SUMINISTRO DE LOS BIENES** objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
6. Que, para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio: Xicoténcatl # 556-5, Zona Centro en Saltillo, Coah., C.P. 25000, correo electrónico Arg.javiersoria@yahoo.com tel.(844) 4102171
7. Que de acuerdo con el Decreto de reformas por el que se modifican diversas Leyes Fiscales y otros ordenamientos federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes.



III.- DE AMBAS PARTES

1. Que se reconocen la personalidad con la que acuden a la firma del presente instrumento.
2. Que cuenta con la capacidad técnica, económica y moral para dar cumplimiento al objeto de este contrato.
3. Que este contrato se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa del contrato número **047/22 AD. MTTO.**

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -

1. "LA UNIVERSIDAD" Encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en **TRABAJOS DE REMODELACION DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN EL JARDÍN DE ACCESO A LA UAAAN, BANQUETAS INTERIORES LADO SUR TERCERA ETAPA**, y este se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cláusulas. En caso de que "EL CONTRATISTA" construya por su propia decisión una obra que no esté especificada en el contrato lo hará bajo su propia cuenta y riesgo, siendo además responsable, en tal supuesto, de los daños y perjuicios que cause "LA UNIVERSIDAD" o a terceros.
2. Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente contrato.
3. Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente contrato.
4. Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos, materia de este contrato, formarán parte del mismo y su uso será obligatorio.
5. Lo anterior en base a la propuesta presentada en el procedimiento citado.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de **\$263,250.00** (Dosecientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) antes de I.V.A. más la cantidad de **\$42,120.00** (Cuarenta y dos mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.) sumando un monto total de **\$305,370.00** (Trescientos cinco mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL CONTRATISTA" Se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día **25 de mayo de 2022** y a terminar a más tardar el día **15 de junio de 2022**, de conformidad con el programa por concepto y con erogaciones mensuales de la obra que se anexa al presente contrato.



1. El plazo pactado para la ejecución de la obra solo podrá ser prorrogado por decisión de "LA UNIVERSIDAD". Si en el desarrollo de los trabajos se presentaran circunstancias por las cuales " LA UNIVERSIDAD" estimará necesario modificar el programa a que se refiere esta cláusula, o bien en el caso de que "EL CONTRATISTA" se viere obligado a solicitar variación a dicho programa por causas no imputables a él, debidamente justificadas y dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, después de que hubiere(n) ocurrido la(s) causa(s) que apoyen su solicitud, "LA UNIVERSIDAD" establecerá la reforma que juzgue pertinente y hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modificaciones que apruebe, y este último a su vez, quedará obligado a aceptarla. Estas modificaciones, o en su caso el nuevo programa que se formulare, se consideraran incorporados a este contrato y, por lo tanto, obligatorio para las partes.

Ruiz

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - " LA UNIVERSIDAD " Se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, debiendo "EL CONTRATISTA" prever y obtener los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

QUINTA. - ANTICIPOS. - Para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato "LA UNIVERSIDAD " **FINIQUITO**

1. En los casos de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "LA UNIVERSIDAD" en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA".
2. "EL CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a una tasa que será igual a la establecida en las leyes fiscales del estado de Coahuila de Zaragoza en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.
3. Igual procedimiento se utilizará para que "EL CONTRATISTA", en su caso, reintegre a "LA UNIVERSIDAD" las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso para la contratación o durante la ejecución de la obra.

SEXTA. - FORMA DE PAGO. - "LA UNIVERSIDAD "pagará a "EL CONTRATISTA" hasta el 90% del monto del contrato, quedando el 10% restante para ser pagado mediante la presentación del acta de recepción y entrega y la estimación de finiquito correspondiente.

SEPTIMA. - GARANTÍAS. - Además de la garantía del anticipo mencionado en la cláusula quinta, "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir, las siguientes garantías:

1. **Fianza de Anticipo:** Consistente en el 100% del monto total del anticipo otorgado, deberá garantizarse con **CHEQUE** expedido por "EL CONTRATISTA" a favor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se presentará antes de la entrega del anticipo. NO PALICA
2. **Fianza de Cumplimiento Del Contrato:** Consistente en el 10% del monto total del contrato antes de IVA, deberá garantizarse con **CHEQUE** expedido por "EL CONTRATISTA" a favor de la



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se presentará antes del trámite de firma del contrato.

- Fianza Para Responder de Obra Mal Ejecutada o Vicios Ocultos.** - Se constituirá **CHEQUE** expedido por **"EL CONTRATISTA"** por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato, a favor de **"LA UNIVERSIDAD"** Autónoma Agraria Antonio Narro, que se presentará el día de la entrega recepción de la obra, si transcurrido este plazo no hubiere otorgado la fianza respectiva **"LA UNIVERSIDAD"** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El cheque garantizará defectos de calidad o de construcción, vicios ocultos, daños y perjuicios que, por inobservancia o negligencia del contratista, se lleguen a causar a terceros, así como el pago de adeudos contraídos por **"EL CONTRATISTA"** con **"LA UNIVERSIDAD"**, durante la ejecución de la obra durante dieciocho meses posteriores a la terminación de la misma. Esta garantía subsistirá durante la ejecución de los trabajos y hasta por dieciocho meses contados a partir de la fecha de terminación de los trabajos, al término de dicho plazo el contratista procederá a su cancelación previa manifestación expresa y por escrito de **"LA UNIVERSIDAD"**.
- En caso de que sean autorizados trabajos adicionales y se amplié el monto del presente contrato mediante uno o más convenios adicionales, deberá presentarse un cheque de cumplimiento y para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos, en los términos que el convenio o solicita.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS. -

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. -

- "EL CONTRATISTA"**, Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la terminación de los trabajos, lo comunicará por escrito a **"LA UNIVERSIDAD"** quien, realizará la recepción de los mismos ya sea total o parcial, conforme a los lineamientos o requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la verificación que esta haga de que están debidamente concluidos, reservándose **"LA UNIVERSIDAD"** el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. **"LA UNIVERSIDAD"** podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. Reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.
- Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán dentro de los 60 días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir acuerdo o en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no acuda a la elaboración de éste, **"LA UNIVERSIDAD"** procederá a elaborarlo, comunicando el resultado a **"EL CONTRATISTA"** en un plazo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de elaboración. **"EL CONTRATISTA"** tendrá un plazo de quince días para realizar reclamaciones o aclaraciones según corresponda a su derecho, en caso de que no realice ninguna reclamación y/o gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.



DÉCIMA. - DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un responsable de obra, que tendrá las funciones y responsabilidades descritas en el artículo 220 del Reglamento de Construcciones para el Estado de Coahuila, nombramiento que deberá hacerlo saber **"EL CONTRATISTA"** por escrito a **"LA UNIVERSIDAD"**. Esta última se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

DÉCIMO PRIMERA. - RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA", en los términos de la Ley Federal del Trabajo, es una empresa establecida que contrata trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que **"LA UNIVERSIDAD"** no será en absoluto responsables con **"EL CONTRATISTA"** respecto a dichas relaciones laborales, las cuales se darán, con exclusividad, entre **"EL CONTRATISTA"** y sus trabajadores.

DÉCIMO SEGUNDA. - SUPERVISIÓN DE LA OBRA. - "LA UNIVERSIDAD", a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto del contrato, así como de inspeccionar los materiales que vayan a usarse en la ejecución de la misma.

DECIMO TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

1. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **"LA UNIVERSIDAD"**, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los desperfectos, falta de calidad en los materiales, defectos o vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"LA UNIVERSIDAD"** o a terceros durante la ejecución de la obra y dentro del término de doce meses siguientes a la fecha de recepción de la misma, pudiendo **"LA UNIVERSIDAD"** ordenar su reparación sin que el contratista tenga derecho a retribución alguna, y que en caso de que el contratista se negare a ejecutar la reparación, **"LA UNIVERSIDAD"** podrá optar por encomendarla a un tercero, con cargo a **"EL CONTRATISTA"**, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos de **"LA UNIVERSIDAD"** para exigir el pago de cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.
2. Igualmente se obliga **"EL CONTRATISTA"** a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos efectuados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de **"LA UNIVERSIDAD"**.

DÉCIMO CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - "LA UNIVERSIDAD" "tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo al programa de obra aprobado, para lo cual **"LA UNIVERSIDAD"** "comparará periódicamente el avance de las obras.



1. Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance de las obras es menor de lo que debió realizarse, "LA UNIVERSIDAD" procederá a:
2. La retención en total de 30 % (treinta por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de las obras hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente. Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor de "LA UNIVERSIDAD" como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".
3. Aplicar, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 20% (veinte por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, calculada por cada semana de retraso que cubrirá "EL CONTRATISTA" mensualmente hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "LA UNIVERSIDAD", presentando el finiquito correspondiente; en el caso de que el retraso sea mayor de un mes "EL CONTRATISTA" deberá cubrir mensualmente el importe de la sanción hasta finalizar la obra. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de "LA UNIVERSIDAD" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".
4. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "LA UNIVERSIDAD" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.
5. En caso de rescisión de contrato por causas imputables al contratista, "LA UNIVERSIDAD" procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberá ejecutarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.
6. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - "LA UNIVERSIDAD" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva. **El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.**

DECIMO SEXTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "LA UNIVERSIDAD" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, así como en los casos:



1. La contravención a las disposiciones, lineamientos y requisitos que establece la ley de obras públicas y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD", además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.
2. Las partes convienen que cuando "LA UNIVERSIDAD" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente se comunicará a "EL CONTRATISTA", exponiéndole las razones que al efecto se tuvieren para que este, dentro del término de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, en el domicilio convencional señalado, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso "LA UNIVERSIDAD" resolverá lo procedente, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL CONTRATISTA".
3. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá suspender la obra, previa notificación por escrito a la universidad, en este supuesto, si opta por rescindir el contrato, lo solicitará a "LA UNIVERSIDAD", la cual decidirá dentro de los 10 días naturales siguientes al de la solicitud; en caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DÉCIMO SÉPTIMA. - SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras públicas y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DÉCIMA OCTAVA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - "EL CONTRATISTA" Acepta que de las estimaciones que le cubra "LA UNIVERSIDAD" se hará la siguiente deducción:

1. El 5/1000 (cinco por cada 1000) del importe de cada estimación por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control.
2. "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones legales de carácter interno o, en su caso de competencia federal y a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, preservación del medio ambiente y uso de la vía pública, así como de cualquier otra naturaleza que corresponda al tipo de la obra encomendada.

DÉCIMA NOVENA. - DIFUSIÓN DE LA OBRA. - "EL CONTRATISTA" Se obliga a construir e instalar en el lugar o lugares que "LA UNIVERSIDAD" le indique, hasta tres letreros relativos a la obra en ejecución, contruidos con estricto apego al modelo que proporcione "LA UNIVERSIDAD", en la inteligencia de que será condición indispensable para que se haga el



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



primer pago de obra ejecutada. Será obligación de **“EL CONTRATISTA”** solicitar los permisos de las autoridades respectivas para la colocación de los mencionados letreros.

VIGESIMA.- ÁREA DE COORDINACIÓN: “LA UNIVERSIDAD”, designa como responsable para el debido cumplimiento del presente contrato al Ing. José Enrique Mandujano Álvarez, Subdirector de Servicios Generales, con facultades para resolver de común acuerdo con su contraparte, todos los asuntos derivados de su aplicación y que no se encuentren previstos en sus cláusulas

VIGESIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de Saltillo Coahuila, por lo tanto, **“EL CONTRATISTA”** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE LAS PARTES DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN CINCO TANTOS EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO “I” QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL 14 DE JUNIO DE 2022, CONSERVANDO CUATRO EJEMPLARES “LA UNIVERSIDAD” Y UN EJEMPLAR “EL CONTRATISTA”.

POR “LA UNIVERSIDAD”

MC. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y APODERADO LEGAL

POR EL “PROVEEDOR”

JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO
APODERADO LEGAL

RESPONSABLE DEL TRABAJO

ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO, CON EL OBJETO DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. TRABAJOS DE REMODELACION DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN EL JARDÍN DE ACCESO A LA UAAAN, BANQUETAS INTERIORES LADO SUR TERCERA ETAPA-----



ANEXO I

JAVIER ARMANDO SORIA ANGUIANO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO"
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
"TRABAJOS DE REMODELACION DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN
JARDÍN DE ACCESO A LA UAAAN BANQUETAS INTERIORES LADO SUR
TERCERA ETAPA"

Clave	Concepto	unidad	cantidad	P. Unitario	Importe
	NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PROTECCION DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
I	ALBAÑILERIA				
1	DESPALME DE TERRENO.	M2	282.00	\$50.00	\$14,100.00
2	NIVELACIÓN DE TERRENO.	M2	282.00	\$60.00	\$16,920.00
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO.	M2	282.00	\$170.00	\$47,940.00
4	VACIADO DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO 8 CM DE ESPESOR.	M2	282.00	\$595.00	\$167,790.00
5	RETIRO DE ESCOMBRO.	LOTE	1.00	\$16,500.00	\$16,500.00
Doscientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.				SUBTOTAL	\$263,250.00
Cuarenta y dos mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.				I.V.A.	\$42,120.00
Trescientos cinco mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.				TOTAL	\$305,370.00

Anguiano

[Handwritten signature]



Universidad Autónoma Agraria Narro Antonio

Necesidades de Mantenimiento y Encuesta Satisfacción de Cliente

Código F 6.17

Fecha Revisión 15/11/07

Revisión No. 0

Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil

Solicitud No. 1168

Fecha Elab. Solicitud: 13/05/2022

Área / Depto.:

Fecha Rec. Mtto. 18/05/2022

Nom. Del Solicitante: ING. JOSE ENRIQUE

Fecha Rec. Supervisor:

MANDUJANO ALVAREZ

Fecha Rec. Material:

Ubicación SUBD. DE SERVICIOS GENERALES

Fecha Elabor. Vale Con.:

Fecha Eng. Oper.y/o Provee:

Acciones a Realizar:

Causa y/o Raíz:

Material requerido:

Marque con una X el recuadro requerido

Herramientas requeridas

- Equipo de Carpintería
- Equipo de Fontanería
- Equipo de Electricidad
- Equipo de Tabla roca
- Equipo de Herrería
- Equipo de Agua

- Equipo de Pintura
- Equipo de Albañilería
- Equipo de Teléfonos
- Equipo de Jardinería
- Equipo de Limpieza
- Equipo de Oficina

Días estimados hábiles de inicio del Mtto

1 3 6 9 12 15 mas

Días estimados hábiles de termino del Mtto

1 3 6 9 12 15 mas

Operadores Requeridos

1 2 3 4 5 6 7

Observaciones:

Nombre y Firma del Supervisor

Nombre y Firma del Oper. / Provee

Fecha, Nombre y Firma del Usuario

Encuesta Satisfacción del Cliente

Tiempo estimado de inicio de Mtto. u Obra.

Tiempo estimado de término de Mtto. u Obra .

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

Los materiales fueron los adecuados para el Mtto.

El mantenimiento se realizó como lo solicitó.

SI NO

BIEN REGULAR MAL

Observaciones:



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Solicitud de Mantenimiento	Código F 6.16	Fecha Revisión 15/11/07	Revisión No. 0
	Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil		

No. Solicitud: 1168 Fecha: 13 de mayo de 2022
Fecha de Falla: _____

Área y/o Departamento: <u>SUBDIR. DE SERVICIOS GENERALES</u>	Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema
Nombre del Solicitante: <u>ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ</u>						

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros : _____

Desperfecto de falla o daño en equipo:
REMDELACIÓN DE PISO DE CONCRETO Y PLAZA EN JARDIN DE ACCESO A LA UAAAN, BANQUETAS
INTERIORES LADO SUR (TERCETA ETAPA)

 <u>ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ</u> Firma Solicitante	Sello de Recibido Mtto. 	 Nombre Recibido en Mtto.
<u>ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ</u> Jefe de Departamento o Área		
